



अपिहिमाल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खण्डेश्वरी, दार्चुला, सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०७९/०८०

फागुन महिना सम्मको

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खण्डेश्वरी, दार्चुला

आ.व. २०७९/८० को मासिक प्रगति विवरण

वडा नः ३



नियमित सेवाहरु

क्र.स	सेवाहरु	सेवाग्राहि संख्या	कैफियत	
१	सिफारिस	५३०		फागुन १३२
२	गुनासो तथा उजुरी	०		
३	पत्र तथा निवेदनहरु दर्ता	८९१		६८०
४	पत्र तथा निवेदनहरु चलानि	७३९		१८६
५				
६				

राजश्व संकलन

क्र.स	सेवाहरु	सेवाग्राहि संख्या	जम्मा राजश्व रकम	कैफियत	
१	भुमिकर/मालपोत	१	२८०		
२	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर				
३	घरवहाल कर				
४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	३४	४४००		
५	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क(न्यायिक,परिक्षा, टेक्का,)	६	३७००		
६	सिफारिश दस्तुर	७०	१३५८०		
७	नाता प्रमाणित दस्तुर	१०	१३००		
८	अन्य दस्तुर(दर्ता, इजाजतपत्र)				
९	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर				
११	व्यवसाय कर	१८	११३५०		
१२	दण्ड, जरिवाना र वाफत				
१३	अन्य कर				
जम्मा		१३९	३४६१०		फागुन ६३

१२४३०

घटना दर्ता

क्र.स	सेवाहरु	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१	जन्म दर्ता	६	१७	२३	
२	मृत्यु दर्ता	१	८	९	
३	विवाह दर्ता	१२		१२	
४	बसाइ सराई	१	१	२	
५	सम्बन्ध विच्छेद				
६	पुर्ण अपाङ्गता दर्ता				
७	आशिक अपाङ्गता दर्ता				

(Handwritten signature)



सामाजिक सुरक्षा

ब. वडा कार्यालय
दिपायल, काठमाडौं, नेपाल
वडा पञ्चिका, काठमाडौं, नेपाल

क्र.स	लक्षित समुह	गत आ व मा नविकरण भएका	पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक		
			नया थप संख्या	लगत कट्टा	जम्मा कायम संख्या	नया थप संख्या	लगत कट्टा	जम्मा कायम संख्या
१	जेस्टनागरीक	८९	१३	१	१०१	१	४	९८
२	जेस्टनागरीक एकल महिला	८	०	०	८	१	०	९
३	विधवा	२३	१	०	२४	२	०	२६
४	पुर्ण अपाङ्गा क वर्ग	१	०	०	१	०	०	१
५	अति असक्त अपाङ्ग ख वर्ग	१०	०	०	१०	०	०	१०
६	दलित बालबालिका	३	०	०	३	०	१	२
	जम्मा	१३४	१४	१	१४७	४	५	१४६

- १ तुलो वडा र विकटताको कारण सेवाग्राहिहरूले आवश्यक कागजात नल्याई आउने र कहिले काही फिर्ता समेत जानु पर्ने
- २ सेवा केन्द्र मार्फत सेवा दिदा लगतहरू वडा र सेवा केन्द्र ल्याउनु र पुर्याउनुमा समस्या
- ३ दरवन्दी अनुसार स्थाई कर्मचारि नहुदा सेवा प्रभावमा समस्या

समस्याको समाधानका उपायहरू

- १ वडामा दरन्दी अनुसार स्थाई कर्मचारी हुनु पर्ने ।
- २ दरवन्दी अनुसार स्थाई कर्मचारि नभएकाहरूलाई तालिमको व्यवस्था मिलाई कार्यालयको कार्यमा चुस्त दुरुस्थ बनाउई

पेश गर्ने
बसन्त सिंह ठेकेरे

प्रमाणित गर्ने

अधिपाल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खण्डेश्वरी, दार्चुला

आ.स. २०७९/८० को मासिक प्रति विवरण
पुर्वाधार विकास

मिति देखि

२०७९/१०/०१

वडा ३ नं
मिति सम्म

२०७९/११/०७

क्र.स	योजनाको नाम	ठेगाना	संचालन प्रकृया	फर्म/उपभोक्ताको नाम	कुल लागत			सम्पन्न गर्ने मिति	भौतिक प्रगति	आर्थिक प्रगति	कैफियत
					कार्यालय तर्फ	लागत साझेदारी/लगात सहभगिता	जम्मा				
१	ड्रिङ्क वि सि बाटो निर्माण योजना	अधिपाल ३ ड्रिङ्क	उपभोक्ता	ड्रिङ्क वि सि बाटो निर्माण योजना							
२	तल्ला ड्रिङ्क रैथाने धारा निर्माण योजना	अधिपाल ३ ड्रिङ्क	उपभोक्ता	गणेशकुमार मण्डि	२५००००		२५००००.		सम्पन्न	१००%	
३	धामीगाउँ कल्भर्ट निर्माण योजना	अधिपाल ३ धामीगाउँ	उपभोक्ता	गणेशकुमार मण्डि	२०००००		२०००००.		सम्पन्न	१००%	
४	भी भी खोला काठेपुल निर्माण योजना	अधिपाल ३ धुम्ती	उपभोक्ता	भी भी खोला काठेपुल निर्माण योजना	५००००	१४१४३.६७	६४१४३.६७		सम्पन्न	१००%	
५	छविस खेल मैदान निर्माण योजना	अधिपाल ३ छविस	उपभोक्ता	अभिषेक मण्डि	५००००		७३१४७.६		सम्पन्न	१००%	
६	तल्लो अमडे खोला आर सि सि पुल निर्माण	अधिपाल ३ डुल्लुङ्गी	उपभोक्ता	गणेशकुमार मण्डि	२०००००	५६५०२.०१	२५६५०२.		सम्पन्न	१००%	
७	कार्लोव्या ढलनिकास निर्माण योजना	अधिपाल ३ कार्लोव्या	उपभोक्ता	गणेशकुमार मण्डि	१०००००	३५२४९.५८	१३५२४९.६		सम्पन्न	१००%	
८	पुष्प चल्दामा स्टेपर पाल्छा पाया सामुदायिक	३ नं वडा पुरे	कार्यालय	वडा कार्यालय	१०००००		१०००००.		सम्पन्न	१००%	
९	सिद्दनाथ आ वि धाजिर फर्निचर निर्माण	अधिपाल ३ धाजिर	उपभोक्ता	सिद्दनाथ आ वि धाजिर वि व्य स	५००००				सम्पन्न		
१०	धाजिर वि सि बाटो सहित ढलनिकास	अधिपाल ३ धाजिर	उपभोक्ता	धाजिर वि सि बाटो सहित ढलनिकास	२०००००				सम्पन्न		भुक्तानी हुन बाकी
११	सिद्दनाथ आ वि कोठा पाट्यन	अधिपाल ३ धाजिर	उपभोक्ता	सिद्दनाथ आ वि धाजिर वि व्य स	१०००००				सम्पन्न		भुक्तानी हुन बाकी
१२	सुर्वाभवाजी आ वि ICT	अधिपाल ३ धुम्ती	विद्युत		६५००००				सम्पन्न		भुक्तानी हुन बाकी
१३	ढलनिकास विशौनाचौर कोर्थी र रंघाडी	अधिपाल ३ विशौनाचौर कोर्थी र रंघाडी	उपभोक्ता	ढलनिकास विशौनाचौर कोर्थी र रंघाडी	३५००००				सम्पन्न		भुक्तानी हुन बाकी
१४	आमा समुह सुदृढीकरण कार्यक्रम	३ नं वडा पुरे		वडा कार्यालय	१०००००				सम्पन्न		भुक्तानी हुन बाकी
१५	कसीती कुवा संरक्षण	अधिपाल ३ कसीती	उपभोक्ता	कसीती कुवा संरक्षण उपभोक्ता समिति	२५०००००				सम्पन्न		भुक्तानी हुन बाकी
१६	सम्भाड रज्या खेती कार्यक्रम	अधिपाल ३ सम्भाड	उपभोक्ता	सम्भाड रज्या खेती कार्यक्रम उपभोक्ता समिति	५००००				सम्पन्न		
१७	पाया स्वास्थ्य चौकी धेरुखाल	अधिपाल ३ पाया	उपभोक्ता	धेरुखाल स्वास्थ्य चौकी धेरुखाल उपभोक्ता समिति	१५००००				सम्पन्न		
१८	बुचे बाको प्रवर्धन कार्यक्रम रन्दल धामी र कलक ओइरे	अधिपाल ३ धेसी र धाजिर	व्याक्ती	रन्दल धामी र कलक ओइरे	१०००००				सम्पन्न		
१९	हिमालय आ वि २ कोठे भवन निर्माण	अधिपाल ३ पाया	विद्युत		५००००				सम्पन्न		
२०	तेल पेल्ले चक्की वडा नं ३	३ नं वडा पुरे		वडा कार्यालय	२७५००००				सम्पन्न		
२१	विविध खर्च तथा कार्यालय संचालन	कार्यालय		वडा कार्यालय	१५००००						
२२	मेसमरी तथा ओजार	कार्यालय		वडा कार्यालय	२०००००						
२३	फर्निचर तथा फिन्चर	कार्यालय		वडा कार्यालय	२०००००						
जम्मा					१५५००००						

सम्पन्न तथा भुक्तानीहरू

- उपभोक्त समिति समयमै गठन गरी सक्दा पनि समयमै सम्पन्नताको लागि नआउने
- काममा उपभोक्ताहरूले पूर्ण श्रवणत चासो नदिएर हाजिरी मात्र लगाउनु पर्ने भावनाको विकास बढी हुनु
- यस वडा विकटता र मौसमी प्रतिकूलताको कारण समयमा नै योजनाको कार्यन्वयन गर्न नसकिनु

सम्पन्नताको समाधानका उपायहरू

१ योजना तथा कार्यक्रम हाइलेटो हाइमि सबै मिलेर दियो कार्य गर्नु पर्छ भनि उपभोक्ता सबैलाई जनचेतामूलक कार्यक्रम मार्फत अभिमुखि करण गरी योजनाको गुणस्तर तथा समयको ख्याल भन्ने बातावरण सिर्जना गर्ने

[Signature]

तयार गर्ने
बसन्त सिंह ठेकेरे

प्रमाणित गर्ने



अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको प्रगति प्रतिवेदन


आर्थिक वर्ष २०७९/०८०

मिति २०७९ साल फागुन



अपिहिमाल गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

खण्डेश्वरी, दार्चुला

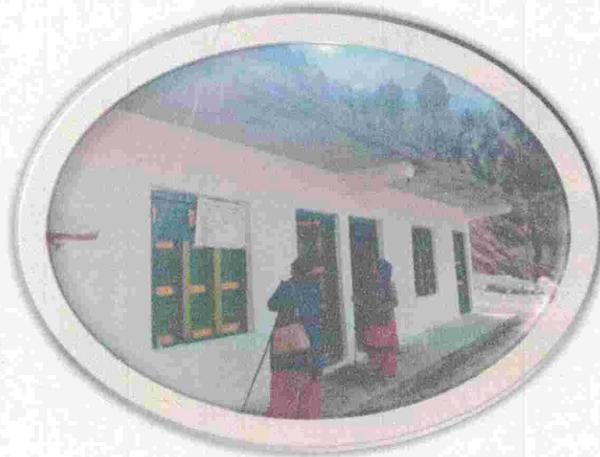


प्रतिवेदन पेश गर्ने:

नरहरि सिंह ठेकरे

अपिहिमाल गाउँपालिका
योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको
प्रतिवेदन

१. परिचय

गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने विकास योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (४) खण्ड (ख) मा भएको ब्यवस्था बमोजिम गरिने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई ब्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउन वाञ्छनीय भएकोले, अपिहिमाल गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यपालिकाले अपिहिमाल गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ बनाई लागू गरेको छ । कार्यविधिको दफा १६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अनुगमन समितिले यो प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिका समक्ष पेश गरेको छ ।

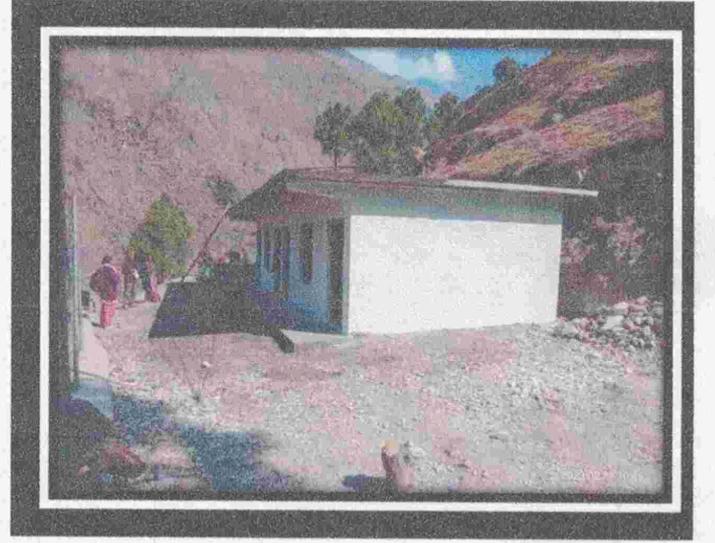

२. उद्देश्य

- कार्यतालिका अनुसार काम भए नभएको एकीन गर्नु ।
- तोकिएको कामको समय लागत र गुणस्तर कायम गर्नु ।
- कार्यान्वयनको क्रममा भएका गल्ती वा कमजोरी तत्काल सुधार गर्नु ।
- डिजाइन वा कार्यान्वयनमा भएका गल्ती सुधार गरी सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुनबाट रोक्नु ।
- आ.व.को अन्तिममा हुने विकास कार्यलाई सुधार गरी समयमै सम्पन्न गराउनु ।

३. भ्रमण तालिका

अनुगमन भ्रमण तालिका					
देखि		सम्म		भ्रमण साधन	गरिएको मुख्य कृयाकलाप
स्थान	मिति	स्थान	मिति		
अपिहिमाल ४, खण्डेश्वरी	२०७९।११।१४	अपिहिमाल ५, सौगन्ना	२०७९।११।१४	पैदल	चौलानी आवि भवन निर्माणको अनुगमन
अपिहिमाल ५, सौगन्ना	२०७९।११।१५	अपिहिमाल ६, मज्जे	२०७९।११।१५	पैदल	मज्जे लघु जल विद्युतको नहर र गौरीशंकर आवि भवन निर्माणको अनुगमन
अपिहिमाल ६, मज्जे	२०७९।११।१६	अपिहिमाल ४, खण्डेश्वरी	२०७९।११।१६	पैदल	चौकीबगर सिचाई अनुगमन गरी फिर्ता


LSC

४. स्रोत साधनको प्राप्ति र प्रयोगका क्रममा स्वीकृत बजेट र समय तालिका कार्यान्वयनको अवस्था

- अहिलेसम्म अनुगमन गरिएका योजनाहरूमा स्थानीय सामाग्री समय तालिका अनुसार संकलन भई प्रयोग गरेको पाईयो ।
- मज्जे लघु जल विद्युत योजनाको काम पहिल्यै सम्पन्न भएको देखियो ।
- गौरी शंकर आ. वि. मज्जेको काम संचालन भएको छ र गैर स्थानीय सामाग्री ढुवानी भएको छ । तर समय कम भएकोले समयमा काम सम्पन्न गर्नको लागि कामको गति बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
- चौलानी आविले काम सम्पन्न गरि सकेकोले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षा शाखाले अनुगमन गरी योजनाको फरफारक गर्नु पर्ने छ ।

५. अपेक्षित प्रतिफलहरू समयमै र लागत प्रभावकारीताको अवस्था

- मज्जे लघु विद्युतको निर्माण कार्य सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन भइ सकेको देखिन्छ ।
- चौलानी आविले निर्माण कार्य समय सिमाभित्र सम्पन्न गरेको देखियो ।
- चौलानी आविको योजनाको लागि विनियोजन गरिएको रकम सम्झौता अनुसार खर्च गरेको देखिन्छ ।
- स्थानीय उपभोक्ता समितिको माँगको आधारमा योजनामा बजेट विनियोजन गरिएकोले लागत अनुसारको काम भने अनुसार सम्पन्न गरिएका छन् ।

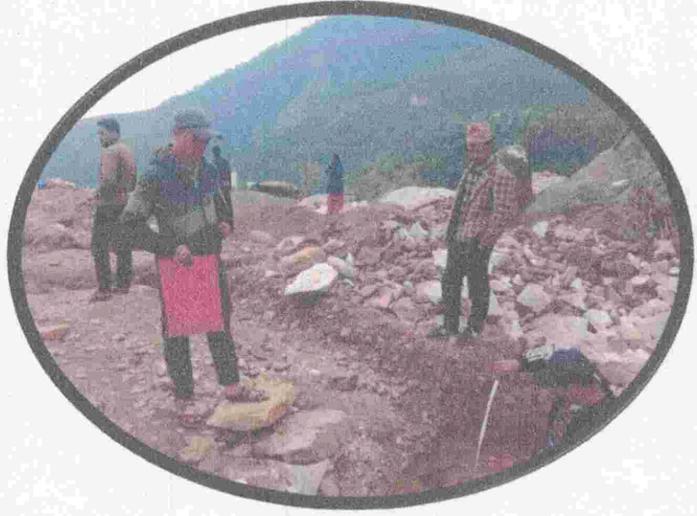

६. कार्यान्वयनकर्ताको कार्यदक्षता र तत्परता

- उपभोक्ता समितिमा कार्यतालिका बनाएर कार्य गर्ने दक्षताको अभाव देखियो ।
- सबै उपभोक्ता समितिभित्र दक्ष र अदक्ष कामदारको प्रयाप्त उलब्धता रहेकोले योजना कार्यान्वयन सरल ढंगले भएको छ ।
- बस्तीस्तरको माँगको आधारमा योजना वितरण गरिएकोले कार्यमा समुदायको उत्साह जनक तत्परता रहेको छ ।
- समयमा काम सकेर भुक्तानी लिनका लागि उपभोक्ताको समयमा काम सम्पन्न गर्ने तत्परता राम्रो रहेको छ ।

७. कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि अवलम्बन गरिएका उपायहरू

- मज्जे लघु जल विद्युतको काम पहिल्यै सम्पन्न भइ सकेकोले कामको कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने समस्या देखियो । सो योजनाको कामको अन्य निकायबाट भुक्तानी भए नभएको वारे समुदायसंग छलफल गरियो । तर कुनै निस्कर्ष निस्कन सकेन ।

(Handwritten signature)

- चिसोले सिमेन्ट सेटमा समस्या हुने क्षेत्रमा पहिला गिट्टी र बालुवा संकलनको काम गरि सक्ने र मौसम अनुकूल भएपछि सिमेन्टको काम गर्ने ।
- गौरी शंकर आ.विको विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई चाडो दक्ष कामदार खोजी काम शुरु गर्न सल्लाह दिइयो ।
- विद्यालय व्यवस्थापनसंगको साझेदारीमा संचालित कामको विद्यार्थी अविभावक समिति मार्फत र शिक्षा शाखा मार्फत अनिवार्य अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सुझाव दिइयो ।

८. अनुगमन समितिको सल्लाह सुझाव

- गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने योजना तथा कार्यक्रमको लागत अनुमान तथा ड्रइड गर्ने कार्य श्रावण महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने ।
- भदौ महिनाभित्र उपभोक्ता समितिहरु गठन गरि सक्ने र लागत अनुमानको वारेमा समितिमा छलफल गर्ने ।
- असोज महिनाभित्र सबै उपभोक्ता समितिलाई सामाजिक परिचालक र प्राविधिकसहित आवश्यक तालिम दिने र संझौताको कार्य सम्पन्न गर्ने ।
- कार्तिक महिनादेखि निर्माण कार्य शुरु गर्ने ।
- भौगोलिक बनावट अनुसार बैशाख महिनाभित्र सबै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ।
- ठेक्काबाट निर्माण गरिने योजनाको हकमा भदौ महिनाभित्र ठेक्का खोली सक्ने ।
- कार्तिक महिनाभित्र ठेकेदारसंग सम्झौता गरि सक्ने ।
- समग्रमा अनुगमनलाई प्रभावकारी ढंगले गर्न गराउन सबै शाखा र वडा कार्यालयले सहयोग गर्ने ।
- हरेक योजनामा वडा प्राविधिकले अनिवार्य नियमित रुपमा सुपरिवेक्षण गर्ने र उपभोक्ता समितिले सल्लाह नमानेमा आफुभन्दा माथिल्लो तहमा जानकारी गराउने ।
- पूर्वाधार विकासको गाउँपालिका तथा वडाबाट अनुगमन भइरहेको र तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमको वारेमा कसरी गर्ने भन्ने छलफल गर्नुपर्ने ।



(Handwritten signature)

९. अनुगमनमा सहभागीहरु


सि.नं	पदाधिकारीको नाम	पद	कैफियत
१	देवकी देवी बोहरा	उपाध्यक्ष	
२	सुर्जना धामी	कार्यपालिका सदस्य	
३	राईमति ठेकरे	कार्यपालिका सदस्य	
४	नरहरि सिंह ठेकरे	योजना अधिकृत	
५	चिरनजीवी सिंह ठेकरे	सब इन्जिनियर	

१०. निष्कर्ष

समग्रमा सचालित योजनाहरूको प्रगति ठिकै देखिएको छ । फिल्डमा काम चलिरहेको बेला प्राविधिकको अनिवार्य उपस्थितिको लागि सिफारीस गर्दछौ । सबै शाखा र वडा कार्यालयलाई अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागि सहयोगको अपेक्षा गर्दछौ ।

नयाँ योजनाको लागि बजेट विनियोजन गर्दा वा डिजाइन स्टीमेट गर्दा पुरानो अवस्था वारे बुझेर गर्नु पर्ने देखिन्छ किनभने मज्जे लघु विद्युत पुरानै निर्माण भएको योजना भएकोले

कसरी भुक्तानी गर्ने चुनौतिको विषय बनेको छ । त्यसैले आगामी बजेट विनियोजन गर्दा पूर्वाधार शाखा मार्फत फिल्डको वास्तविक अवस्थाको प्रतिवेदन माँग गरी गर्न सुझाव दिइन्छ ।

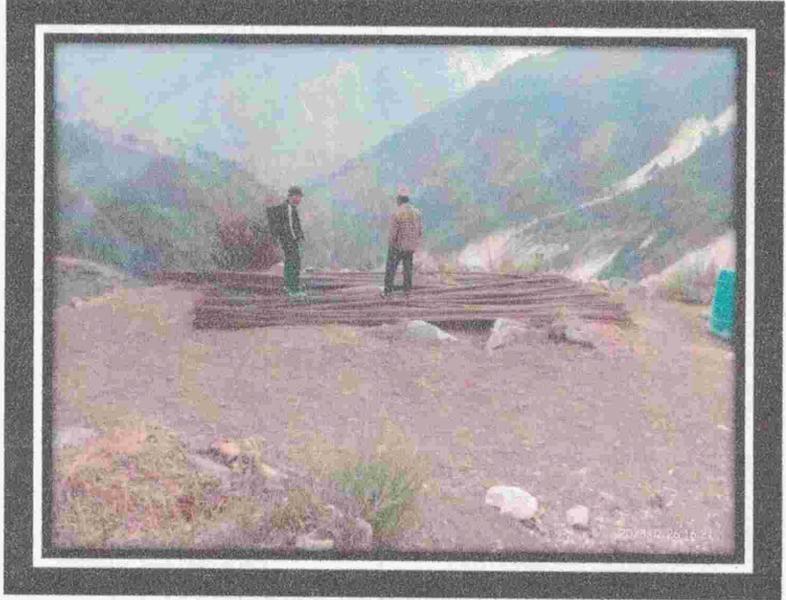

नरहरि सिंह ठेकरे
अनुगमन समिति सचिव
मिति: २०७९।१२।०१

अपिहिमाल गाउँपालिका
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाई
खण्डेश्वरी, दार्चुला
मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.ब. २०७९/०८०

मिति: २०७९/१२/०८

महिना: फागुन

सि.नं.	कृयाकलापहरु:	समस्या तथा चुनौती	कैफियत:
१	सामाजिक सुरक्षा नाम दर्ता, लगत कट्टा गर्ने कार्य	वडा कार्यालयमा मृत्यु भएका, नयाँ थप गर्नुपर्ने लाभग्राहीको जानकारी सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाईमा जानकारी गराउन हुन	
२	घटना दर्ता गर्ने कार्य		
३	मासिक घटना दर्ता रिपोर्ट विभागमा पठाउने कार्य		
४	अपिहिमाल गाउँपालिका भित्रका ६ वटै वडा कार्यालयको लागि सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी व्यानर छपाई गर्ने कार्य ।		सम्पन्न हुन बाकी
५	सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि बैंक सँग समन्वय गर्ने कार्य		
६	अन्य दैनिक कार्यालय कामकाज		

प्रतिवेदन पेश गर्ने

दिपक राम टमटा

(MIS Operator)

अपिहिमाल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खण्डेश्वरी, दार्चुला

आ.व. २०७९/८० का मासिक प्रगत अववरण
योजना तथा पूर्वाधार विकास

मिति २०७९-११-०१		देखि		मिति २०७९-११-३० सम्म								
क्र.स.	योजनाको नाम	ठेगाना	संचालन प्रकृया	फर्म/उपभोक्ताको नाम	कुल लागत			सम्पन्नता मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	भौतिक प्रगति	आर्थिक प्रगति	कैफियत
					कार्यालय तर्फ	साझेदारी/लागत सहभागिता	जम्मा					
वडा न. १												
१	भवानी आ.वि. सिति २ कोठे भवन पालास्टर र रङगोगन	अपिहिमाल १ सिति	उपभोक्ता	भवानी आ.वि. सिति २ कोठे भवन पालास्टर र रङगोगन उपभोक्ता समिति	१९२०००	४८१४३.९	240143.9	०९/१३/२०७९	०३/२०/२०८०	१००%		
२	गुरुसाड पार्सप ढल विकास	अपिहिमाल १ गुरुसाड	उपभोक्ता	गुरुसाड पार्सप ढल विकास उपभोक्ता समिति	२०००००	५५४२७.७३	255427.7	०९/०४/२०७९	०३/१५/२०८०	१००%		
३	आरुखोड ढल विकास निर्माण	अपिहिमाल १ आरुखोड	उपभोक्ता	आरुखोड ढल विकास निर्माण उपभोक्ता समिति	९५००००	२६६१७७.७२	1216177.7	०८/१०/२०७९	०३/२०/२०८०	१००%	३०%	
४	भट्टार रातापानी वृक्षारोपण	अपिहिमाल १ भट्टार	उपभोक्ता	भट्टार रातापानी वृक्षारोपण उपभोक्ता समिति	१०००००	२९६७७.२५	129677.3	०९/०३/२०७९	०३/२०/२०८०	०%		
५	लुम्चा धल्देउ मन्दिर निर्माण	अपिहिमाल १ लुम्चा	उपभोक्ता	लुम्चा धल्देउ मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	३०००००	१३५८१०.०२	435810.0	०८/२१/२०७९	०३/२०/२०८०	१००%		
६	महादेव मन्दिर निर्माण	अपिहिमाल १ सिति	उपभोक्ता	महादेव मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	७५००००	२०२२३६.८५	952236.9	०९/०३/२०७९	०२/२०/२०८०	१००%		
७	लटिनाथ मन्दिर निर्माण	अपिहिमाल १ सिति	उपभोक्ता	लटिनाथ मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	७५००००	१६६६९४.५४	916694.5	०८/२३/२०७९	०२/२३/२०८०	१००%		
८	पर्यटक आराम आश्रय निर्माण	अपिहिमाल १ धौलिऔडार	उपभोक्ता	पर्यटक आराम आश्रय निर्माण उपभोक्ता समिति	१५०००००	४००४२८.७	1900428.7	०९/१७/२०७९	०३/२०/२०८०	१००%		
कुल रकम					४७४२०००	१३०४५९७	६०४६५९७					
वडा न. २												
१	धुसा स्वस्थ चौकी पछाडी बाटो निर्माण	अपिहिमाल २ पाटु	उपभोक्ता	धुसा स्वस्थ चौकी पछाडी बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	300,000.00	93,452.74	381,452.74	०९/०४/२०७९	०३/२०/२०८०	१००%		
२	साकार मन्दिर निर्माण	अपिहिमाल २ साकार	उपभोक्ता	साकार मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	150,000.00	36,186.46	180,186.46	०९/०८/२०७९	०१/३०/२०८०	१००%		

[Handwritten signature]

३	दैभात पिसिसि बाटो निर्माण	अपिहिमाल २ दैभात	उपभोक्ता	दैभात पिसिसि बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	200,000.00	59,153.50	251,153.50	०९/०४/२०७९	०३/२०/२०८०	८०%		
४	घुसा घट्टे खोला पुल निर्माण	अपिहिमाल २ घुसा	उपभोक्ता	घुसा घट्टे खोला पुल उपभोक्ता समिति	300,000.00	71,625.66	359,625.66	०९/०५/२०७९	०३/२०/२०८०	३०%		
५	घुसा स्वस्थ चौकी देखि लिथि सम्म घोरेटो बाटो निर्माण	अपिहिमाल २ लिथि	उपभोक्ता	घुसा स्वस्थ चौकी देखि लिथि सम्म घोरेटो बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	300,000.00	101,483.50	389,483.50	०९/११/२०७९	१२/३०/२०७९	१००%		
६	कालापहरा वृक्षारोपण योजना	अपिहिमाल २ घुसा	उपभोक्ता	कालापहरा वृक्षारोपण योजना उपभोक्ता समिति	150,000.00	48,964.06	192,964.06	०९/०७/२०७९	०३/२०/२०८०	०%		
७	कहादेव मावि फििल्ड निर्माण	अपिहिमाल २ घुसा	वि.व्य.स.	महादेव मा.वि. घुसा फििल्ड निर्माण वि.व्य.स.	500,000.00	140,276.13	620,276.13	०९/०५/२०७९	०३/२०/२०८०	१००%	१००	
कुल रकम					1,900,000.00	551,142.05	2,375,142.05					

वडा नं. ३

१	झुस्कु पि सि सि बाटो निर्माण योजना	अपिहिमाल ३ झुस्कु	उपभोक्ता	झुस्कु पि सि सि बाटो निर्माण योजना उपभोक्ता समिति	२५००००	६८४०६.४७	३०८४०६.४७	२०७९/०८/१८	२०८०/३/२०	१००%	१००%	
२	तल्ला झुस्कु रैथाने धारा निर्माण योजना	अपिहिमाल ३ झुस्कु	उपभोक्ता	तल्ला झुस्कु रैथाने धारा निर्माण योजना उपभोक्ता समिति	२०००००	५०८९०.२९	४२२८९०.२९	२०७९/०८/२१	२०८०/३/२०	१००%	१००%	
३	धामीगाउँ कल्भर्ट निर्माण योजना	अपिहिमाल ३ धामीगाउँ	उपभोक्ता	धामीगाउँ कल्भर्ट निर्माण योजना उपभोक्ता समिति	५००००	१४१४३.६७	६२१४३.६७	२०७९/०८/२७	२०८०/३/२०	१००%	१००%	
४	भौ भौ खोला काठेपुल निर्माण योजना	अपिहिमाल ३ धुनी	उपभोक्ता	भौ भौ खोला काठेपुल निर्माण योजना उपभोक्ता समिति	५००००	२३१४७.६०	७११४७.६०	२०७९/०८/२८	२०८०/३/२०	१००%	१००%	
५	छविस खेल मैदान निर्माण योजना	अपिहिमाल ३ छविस	उपभोक्ता	छविस खेल मैदान निर्माण योजना उपभोक्ता समिति	२०००००	५६५०२.०१	२४८५०२.०१	२०७९/०८/२९	२०८०/३/२०	१००%	१००%	
६	तल्लो अमडे खोला आर सि सि पुल निर्माण	अपिहिमाल ३ तुल्हुङ्गी	उपभोक्ता	तल्लो अमडे खोला आर सि सि पुल निर्माण उपभोक्ता समिति	१०००००	३५२४९.५८	१३१२४९.५८	२०७९/०८/२७	२०८०/३/२०	१००%	१००%	
७	काल्जौवया ढल निकास निर्माण योजना	अपिहिमाल ३ काल्जौवया	उपभोक्ता	काल्जौवया ढल निकास निर्माण योजना उपभोक्ता समिति	१०००००	२८५७६.११	१२४५७६.११	२०७९/०८/२७	२०८०/३/२०	१००%	१००%	
८	युवा क्लबलाई स्टेचर वितरण तथा सामुदायिक संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	३ नं वडा पुर्	कार्यालय	वडा कार्यालय	१०००००					१००%	०%	

[Handwritten Signature]

९	कसौती कुवा संरक्षण	अपिहिमाल ३ कसौती	उपभोक्ता	कसौती कुवा संरक्षण उपभोक्ता समिति	५००००	१४०००	६४०००	२०७९/११/२१	२०८०/२/१५			
१०	सिद्धनाथ आ वि घाजिर फर्निचर निर्माण	अपिहिमाल ३ घाजिर	उपभोक्ता	सिद्धनाथ आ वि घाजिर वि व्य स	५००००			२०७९/११/२१	२०८०/२/१५			
११	घाजिर पि सि सि वाटो सहित ढल निकास	अपिहिमाल ३ घाजिर	उपभोक्ता	घाजिर पि सि सि वाटो सहित ढलनिकास उपभोक्ता समिति	२०००००	५३४७९.२	२४५४७९.२	२०७९/११/२१	२०८०/३/२०	१००		
१२	पाथा स्वास्थ्य चौकी घेर पर्खाल	अपिहिमाल ३ पाथा	उपभोक्ता	पाथा स्वास्थ्य चौकी घेर पर्खाल उपभोक्ता समिति	१०००००					५०		
१३	शिद्धनाथ आ वि कोठा पार्टसन	अपिहिमाल ३ घाजिर	उपभोक्ता	सिद्धनाथ आ वि घाजिर वि व्य स	१०००००	२१६८५.७	११७६८५.७			१००		
१४	ढल निकास विशौना चौर कोर्धी र रंघाडी	अपिहिमाल ३ विशौनाचौर कोर्धी र रंघाडी	उपभोक्ता	ढलनिकास विशौनाचौर कोर्धी र रंघाडी उपभोक्ता समिति	३,५०,०००	४७,२९,०१२६		२०७९/११/११	२०८०/३/२०	५०		
१५	परम्परागत कोलु (तेल पेल्ले) स्थापना	अपिहिमाल ३ थुम्ती	उपभोक्ता	परम्परागत कोलु (तेल पेल्ले) स्थापना उपभोक्ता समिति	५०,०००	१२६९४४३	६०६९४४३	२०७९/११/२१	२०८०/३/२०	१००%	१००%	
१६	सुर्माभवानी आ.वि. आईसिटि निर्माण	अपिहिमाल ३ मेलदुङ्गा	उपभोक्ता	सुर्माभवानी आ.वि. आईसिटि निर्माण उपभोक्ता समिति	६,५०,०००	५१८१८४०	७०१८१८४०	२०७९-०९-२८	२०८०-०३-२०			
१७	तेल पेल्ले चक्की वडा नं ३	३ नं वडा पुी		वडा कार्यालय	१०००००							
१८	स्याउजे मन्दिर पुन निर्माण	क्षेत्ती		क्षेत्ती क्षेत्र विकास समिति	३००००००	३०००००	३३०००००	२०७९/१२/१८	२०८०/३/२०	२०%	०	
कुल रकम					२५०००००.००	३६६०८०.६३	१७९६०८०.६३					

वडा न. ४

सं	खतोली ट्याक्टर खरिद १(दलित),गैरदलित)	खतोली	उपभोक्ता	खतोली ट्याक्टर खरिद २(दलित,गैरदलित)	200,000.00	1,178,177.72			50%		सम्झौता नभएको	
२	खण्डेश्वरी मा.वि. फर्निचर निर्माण	खण्डेश्वरी मा.वि.	वि.व्य.व.स.	खण्डेश्वरी मा.वि. फर्निचर निर्माण	100,000.00	35,939.00	131,939.80	०९/२०/२०७९	०३/२०/२०८०	५०%	०%	
३	खाती सामुदायिक वन घेरपर्खाल निर्माण	खाती सा.व.	उपभोक्ता	खाती सामुदायिक वन घेरपर्खाल निर्माण	100,000.00	37,103.43	157,103.43	०८/२९/२०७९	०३/२०/२०८०	५०%	०%	
४	चौविसन स्याउ बगैचा घेरपर्खाल निर्माण	चौविसन	उपभोक्ता	चौविसन स्याउ बगैचा घेरपर्खाल निर्माण	200,000.00	49,629.29	241,629.29	०८/१८/२०७९	०३/२०/२०८०	१००%	०%	
५	तामाखानी आ.वि. फर्निचर निर्माण	तामाखानी आ.वि.	वि.व्य.व.स.	तामाखानी आ.वि. घेरपर्खाल निर्माण	100,000.00	27,384.11	123,384.11	०९/१७/२०७९	०३/२०/२०८०	१००%	०%	
६	थापाना मन्दिर निर्माण	देउरुख	उपभोक्ता	थापाना मन्दिर निर्माण	175,000.00	39,492.25	207,492.25	१०/१९/२०७९	०३/२०/२०८०	१००%	१००%	

Handwritten signature

✓ ७	प्रतिशालय र फिल्ड निर्माण नौपाटा	नौपाटा	उपभोक्ता	प्रतिशालय र फिल्ड निर्माण नौपाटा	200,000.00	63,684.67	255,684.67	०९/०९/२०७९	०३/२०/२०८०	१००%	०%
✓ १०	पानीमूल संरक्षण तथा घट्ट व्यवस्थापन	खल्कोट	उपभोक्ता	पानीमूल संरक्षण तथा घट्ट व्यवस्थापन	200,000.00	707,477.43	263,747.43	१०/१८/२०७९	१२/०९/२०७९	१००%	०%
✓ ११	राउला घोरेटो बाटो निर्माण	राउला	उपभोक्ता	राउला घोरेटो बाटो निर्माण	125,000.00	36,498.77	156,498.77	०८/१३/२०७९	०३/२०/२०८०	१००%	०%
✓ १२	लम्थेङ्ग गाउँ घोरेटो बाटो	लम्थेङ्ग	उपभोक्ता	लम्थेङ्ग गाउँ घोरेटो बाटो	125,000.00	37,078.64	157,078.64	०८/१३/२०७९	०३/२०/२०८०	१००%	०%
✓ १३	वडा कार्यालयमा प्रतिशालय फिल्ड बाटो निर्माण	वडा नं. ४ को कार्यालय	उपभोक्ता	वडा कार्यालयमा प्रतिशालय फिल्ड बाटो निर्माण	600,000.00	159,253.84	735,253.84	०८/०९/२०७९	०३/२०/२०८०	१००%	०%
१४	सरस्वती आ.वि. फर्निचर निर्माण	सरस्वती आ.वि. मरखोला	वि.व्य.व.स.	सरस्वती आ.वि. फर्निचर निर्माण	100,000.00	36,206.28	132,206.28	०९/०८/२०७९	०३/२०/२०८०	१००%	०%
१५	वडा कार्यालय पछाडि मेसनरि वाल निर्माण	वडा नं. ४ को कार्यालय	उपभोक्ता	वडा कार्यालय पछाडि मेसनरि वाल	130,000.00	31,935.84	156,935.84	०७/१६/२०७९	१२/२०/२०७९	१००%	१००%
१६	खण्डेश्वरी मा.वि. दिवा भान्सा घर निर्माण	खण्डेश्वरी मा.वि.	वि.व्य.व.स.	खण्डेश्वरी मा.वि. दिवा भान्सा घर निर्माण	250,000.00	73,467.62	313,467.62	०९/२०/२०७९	०३/२०/२०८०	१००%	०%
✓ १७	पौषटिक आहार भान्सा घर भवन (सरस्वती आ.वि.)	सरस्वती आ.वि. मरखोला	वि.व्य.व.स.	पौषटिक आहार भान्सा घर भवन (सरस्वती आ.वि.)	250,000.00	83,430.35	323,430.35	०९/१७/२०७९	०३/२०/२०८०	१००%	०%
कुल रकम					2,855,000.00	1,418,581.52	4,534,030.04				

वडा नं. ५

✓ १	आरन भवन निर्माण	अपिहिमाल ५ लुम्थी	उपभोक्ता	आरन भवन निर्माण योजना उपभोक्ता समिति	१०००००	१०३१३५	२०३१३५.३	२०७९/१८/१९	२०७९/१२/३०	१००%	०%
✓ २	तिम्ला देखि सौगना सम्म रेलिड बाटो	अपिहिमाल ५ तल्लोफेर	उपभोक्ता	तिम्ला देखि सौगना सम्म रेलिड बाटो निर्माण योजना उपभोक्ता समिति	३०००००	९०१८७.५१	३९०१८७.५	२०७९/१९/३	२०७९/१२/३०	१००%	०%
✓ ३	पारी तिम्ला घोरेटो बाटो निर्माण योजना	अपिहिमाल ५ तल्लोफेर	उपभोक्ता	पारि तिम्ला घोरेटो बाटो निर्माण योजना उपभोक्ता समिति	१५००००	३६३०९.३९	१८६३०९.४	२०७९/१९/७	२०७९/१२/३०	१००%	०%
४	पारी लुम्थी ढल निकास निर्माण योजना	अपिहिमाल ५ लुम्थी	उपभोक्ता	पारी लुम्थी ढल निकास निर्माण योजना उपभोक्ता समिति	५०००००	१३६४६.८२	५१३६४६.८	२०७९/१८/१८	२०७९/१२/३०	१००%	०%
५	पसरील मस्टा मन्दिर तारजाली निर्माण योजना	अपिहिमाल ५ लुम्थी	उपभोक्ता	पसरील मस्टा मन्दिर तारजाली निर्माण योजना उपभोक्ता समिति	४०००००	९३०९२.०६	४९३०९२.१	२०७९/१८/१८	२०७९/१२/३०	१००%	०%

Handwritten signature

६	चौलानी आ वि २ कोठे भवन निर्माण योजना	अपिहिमाल ५ तल्लोफेर	वि व्य स	चौलानी आ वि	१४०००००	५३५४१४.३	९३५४१४.३	२०७९/१९/१७	२०७९/१९/२३०	१००%	०%	
७	भवानी मा वि फिल्ड निर्माण	अपिहिमाल ५ सौगना	वि व्य स	वि व्य स	१५००००		१५००००.			५०%	०%	
८	भवानी मा वि कार्पेट खरिद	अपिहिमाल ५ सौगना	वि व्य स	वि व्य स	१०००००		१०००००.			५०%	०%	
९	मकरीगाड बजार फोहरमैला व्यवस्थापन प्रणाली	अपिहिमाल ५ मकरीगाड	उपभोक्ता	मकरीगाड बजार फोहरमैला व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण उपभोक्ता समिति	१००००००	१००००००.००	२००००००.	२०७९/०७/२२	२०७९/१९/२३०	१००%	१००%	
१०	फर्निचर तथा फिक्चर्स एवम ग्लिल निर्माण	अपिहिमाल ५ कार्यालय		वडा कार्यालय	३५००००		३५००००.			१००%	०%	सामान खरिद भएको
कुल रकम					४४५००००.०	१८७९७८५.४	६३२९७८५.४					

वडा न. ६

१	छिपुलकेदार मा.वि. आईसिटी निर्माण	अपिहिमाल ६ धकं	वि व्य स	वि व्य स	६५००००	१३४४४.३	६६३४४.३	२०७९/१९/२६	२०८०/३/२०	०%		
२	गौरिशंकर आ.वि. भवन निर्माण	अपिहिमाल ६ मञ्जे	उपभोक्ता	गौरिशंकर आ.वि. भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	५००००००	१४७०४५५.४	६२७०४५५.४	२०७९/१९/२६	२०८०/३/२०	३०%		
३	रिगुर सुधारिएको घट्ट निर्माण	अपिहिमाल ६ रिगुर	उपभोक्ता	रिगुर सुधारिएको घट्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	१०००००	२५१४४.६४	१२११४४.६४	२०७९/१९/११	२०८०/३/२०	८०%		
४	धकं सुधारिएको घट्ट निर्माण	अपिहिमाल ६ धकं	उपभोक्ता	धकं सुधारिएको घट्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	१०००००	२५१४४.६४	१२११४४.६४	२०७९/१९/११	२०८०/३/२०	८०%		
५	वडा कार्यालय फिल्ड सिडि पि सि सि निर्माण	अपिहिमाल ६ धकं	उपभोक्ता	वडा कार्यालय फिल्ड सिडि पि सि सि निर्माण उपभोक्ता समिति	३०००००	६८००१.४६	३५६००१.४६	२०७९/१९/११	२०८०/३/२०	८०%		
६	सेली खडन्ची घोबा निर्माण	अपिहिमाल ६ सेली	उपभोक्ता	सेली खडन्ची घोबा निर्माण उपभोक्ता समिति	२५००००	९०४५०.६२	३३०४५०.६२	२०७९/१९/१२	२०८०/३/२०	८०%		
७	मल्लो पाडचिम्फु देखि खडियान घोबा निर्माण	अपिहिमाल ६ पाडचिम्फु	उपभोक्ता	मल्लो पाडचिम्फु देखि खडियान घोबा निर्माण उपभोक्ता समिति	२५००००	९०४५०.६२	३३०४५०.६२	२०७९/१९/१२	२०८०/३/२०	१००%		
८	राडचिम मन्दिर निर्माण	अपिहिमाल ६ सितोला	उपभोक्ता	राडचिम मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	५०००००	१०११८३.९१	५०११८३.९१	२०७९/१८/८	२०७९/१९/२३०	८०%		
९	भवानी आ.वि. फिल्ड तथा फर्निचर निर्माण	अपिहिमाल ६ देउली	वि व्य स		२०००००	६५९१५.४	२५७९१५.४	२०७९/१९/२४	२०८०/३/२०	८०%		

(Handwritten signature)

१०	मञ्जे लघु जलविद्युत निर्माण	अपिहिमाल ६	उपभो	मञ्जे लघु जलविद्युत निर्माण उपभोक्ता समिति	४०००००	९५१७५२.४८	७९१७५२.४८	२०७९।९।८	२०८०।१।२०	१००%		
११	चौकिबगर सिचाइ निर्माण	अपिहिमाल ६ चौकिबगर	उपभोक्ता	चौकिबगर सिचाइ निर्माण उपभोक्ता समिति	५०००००	१३७३२८.८८	६१७३२८.८८	२०७९।९।१३	२०८०।३।२०	८०%		
१२	फुटेपइरा देखि सल्याङ झो पु सम्म घो बा निर्माण	अपिहिमाल ६ फुटेपइरा	उपभोक्ता	फुटेपइरा देखि सल्याङ झो पु सम्म घो बा निर्माण उपभोक्ता समिति	२५००००	७९५५४.३७	३१९५५४.३७	२०७९।९।१३	२०८०।३।२०	१००%		
कुल रकम					१२१०००००	३१९८८२७	१४७६०८२७					

ठेक्का सम्बन्धी: आ.व २०७९-०८०

सिन	योजनाको नाम	ठेगाना	संचालन प्रकृया	फर्म/उपभोक्ताको नाम	ला.अ. रकम(श्याट बाहेक)	Bid रकम(श्याट बाहेक)						
१	अपिहिमाल चौकीबगर देखि नौगाड जोड्ने सडक निर्माण योजना	अपिहिमाल ६	ठेक्का	अपिहिमाल नि से & बुढाथोकी सप्लायर्स अपिहिमाल ६	२११३५४५.८७	२१०३७१६.०२	२०७९।९।२५	२०८०।३।२०		२०		
२	वडा न. १ वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य	अपिहिमाल १	ठेक्का	अपिहिमाल निर्माण सेवा अपिहिमाल १	२३.७५.३१८.००	२३५८४७९.१७	२०७९।९।२५	२०८०।३।२०	२०%			
३	मकरिकोट देखि खात्ती सम्म पर्यटकीय पिसिसि बाटो निर्माण	अपिहिमाल ४	ई-बिडिड	अपिहिमाल निर्माण सेवा अपिहिमाल १	८४९५६४१.५८	०	८४९५६४२	२०७९।११।१९	२०८०।३।२०	०		
४	अपिहिमाल वडा न.४ ढलनिकास निर्माण योजना	अपिहिमाल ४	ई-बिडिड	अपिहिमाल निर्माण सेवा अपिहिमाल १	१२८१२९९०.५	०	१२८१२९९०	२०७९।११।१९	२०८०।३।२०	०		

Handwritten signature

समस्या तथा चुनौतीहरू

१	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समयमा आर्थिक अख्तियारी नआउनु ।
२	केही फर्मेटहरू परिवर्तन गरिएकाले फिल्डका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई बुझाउन समय लागेको ।
३	चिसोका कारण सिमेन्टबाट निर्मित योजनाहरूको काम गर्न नसकिएको ।
४	निर्माण कार्यमा श्रमदान बढी भयो भन्ने गुनासो ।

समस्याको समाधानका उपायहरू

१	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अख्तियारी आएपछि भुक्तानका काम शुरु भएको ।
२	योजना शाखाबाट फर्मेटका बारेमा नियमित फोन मार्फत अभिमुखिकरण गरिएको ।
३	अलि मौसम अनुकूल भएपछि सिमेन्टबाट निर्मित कार्य गर्ने ।
४	निर्माण कार्यमा श्रमदानको रकम घटाउन गाउँ कार्यपालिकामा छलफल गर्ने ।

तयार पार्ने



सिफारिस गर्ने

अधिभाल गाउँपालिका खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता ईकाई



खण्डेशी दाखुला
मिति: २०७९ मंसिर १९ गते

अधिभाल गाउँपालिका प्रगति विवरण

संयोजित प्रिण्ट, प्रिण्ट

अधिक प्रगति

लाभान्वित घर दुरी

लाभान्वित जनसंख्या

उपभोक्ता समिति संरचना

कुल लागत

कार्यालय तर्फ

लागत साझेदारी / लागत सहभागिता

जम्मा

स्व: लगानी

जनसहभागिता

सम्बन्धिता मिति

सम्यत्र गर्ने मिति

भौतिक प्रगति

अधिक प्रगति

लाभान्वित घर दुरी

लाभान्वित जनसंख्या

उपभोक्ता समिति संरचना

कुल जम्मा

प्राथमिक मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिमा

वास पुग्दि

मर्मत सम्भार कार्यकर्ता

२३९९४

०

०

२३९९४

२०७९/११/२२

१०० प्रतिशत

१०० प्रतिशत

८

१

०

७

८

८

३

०

३६

१९

२०

३९

१

०

८

५

५

९

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

७

अधिहमाल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खण्डेश्वरी, दाचुला

आ.व. २०७९/८० को मासिक प्रगति विवरण

रोजगार सेवा केन्द्र

मिति २०७९-१०-०१

मिति २०७९-१०-३० सम्म

क्र.सं.	योजनाको नाम	संचालन प्रकार्य	वडा नं.	कुल लागत	लागत साझेदारी/लागत सहभागिता	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्ने मिति	भौतिक प्रगति
				कार्यालय तर्फ	जम्मा			
1	लुम्बा घो बा निर्माण		१		४००००	२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	९० प्रतिशत
2	तल्लो ल्वाथी देखि मल्लो ल्वाथी सम्म घो बा निर्माण		१		८००००	२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	९० प्रतिशत
3	सिति पाडर खोला बाटो सहित ढलनिकास निर्माण		१		३५६०००	२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	९० प्रतिशत
4	आरु खोड घो बा निर्माण		१		१८००००	२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	९० प्रतिशत
5	गुरुखोला खडन्ची बाटो निर्माण पाटु/थाला		२		७४९१९	२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	९० प्रतिशत
6	छुमछुम देखि दैभात खडन्ची बाटो निर्माण		२		१०९४९७	२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	९० प्रतिशत
7	बगरधार देखि दोबाटो सम्म खडन्ची बाटो निर्माण		२			२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	
8	कुटुली देखि माँडौँ सम्म खडन्ची बाटो निर्माण		२		५१८६७	२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	८० प्रतिशत
9	भारडाडा देखि धाराखोला सम्म खडन्ची बाटो निर्माण		२		४२०६२९	२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	८० प्रतिशत
10	घाजिर खडन्ची बाटो निर्माण		३		२०५६४३	२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	९० प्रतिशत
11	मरफुल खडन्ची बाटो निर्माण		३		१५०८०५	२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	९० प्रतिशत
12	विसौना चौर बाटो निर्माण		३		१२४६३२	२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	९० प्रतिशत
13	पाथा रंघाडी कोठेपूल निर्माण		३		११९९५८	२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	९० प्रतिशत
14	शुर्मा भवानी आ बि घेर पर्खाल निर्माण		३		४०३०००	२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	९० प्रतिशत
15	धामी गाउँ देखि रज्युडा सम्म खडन्ची बाटो निर्माण		३			२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	९० प्रतिशत
16	काल्जीवया देखि राउला सम्म खडन्ची बाटो निर्माण		३			२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	९० प्रतिशत
17	चौड देखि दुधिला सम्म घो बा निर्माण		३			२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	९० प्रतिशत
18	मरफूल देखि मेन पेल्ले सम्म खडन्ची बाटो निर्माण		३			२०७९/८/१९	२०७९/११/३०	८० प्रतिशत

 रोजगार संग्रोजक

19	पाथा गाउँदेखि पुरानो पन्यार सम्म खडन्ची बाटो निर्माण	३			२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	८० प्रतिशत
20	पाथा म्वास्थ्य चौकी घेर पर्खाल निर्माण	३			२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	८० प्रतिशत
21	गजुखोला देखि तोथ्याल सम्म खडन्ची बाटो निर्माण	३			२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	८० प्रतिशत
22	क्षेत्री खडन्ची बाटो निर्माण	३			२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	८० प्रतिशत
23	तामाखानी आ वि घेर पर्खाल निर्माण	४		१०००००	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	९० प्रतिशत
24	खण्डेश्वरी मा वि बाटो निर्माण	४		२४००००	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	९० प्रतिशत
25	छडेखोला बाटो निर्माण	४		१५००००	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	९० प्रतिशत
26	पासेखोला बाटो निर्माण	४		१०००००	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	९० प्रतिशत
27	चाँविसन देखि चिल्डुङ्गा जाने बाटो निर्माण	४		१५००००	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	९० प्रतिशत
28	चिल्डुङ्गा देखि तामाखानी जाने बाटो निर्माण	४		१५००००	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	९० प्रतिशत
29	खत्तौली देखि राउला जाने बाटो निर्माण	४		१०००००	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	९० प्रतिशत
30	छयाङपाङ जाने बाटो निर्माण	४		१५००००	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	९० प्रतिशत
31	छडेखोला नौपाटा जाने बाटो निर्माण	४		१५००००	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	९० प्रतिशत
32	खल्कोट देखि बाँकेडुङ्गा हुँदै सल्ली सम्मा बाटो निर्माण	४		१५००००	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	९० प्रतिशत
33	पारी तिम्ला खडन्ची बाटो निर्माण	५		२३०८००	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	८० प्रतिशत
34	पारी लुम्थी खडन्ची बाटो निर्माण क्रमगत	५		२४८११०	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	८० प्रतिशत
35	सौगन्ना खडन्ची बाटो निर्माण क्रमगत	५		२८८५००	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	८० प्रतिशत
36	गौरी शंकर आ वि मज्जे फिल्ड निर्माण	६		५५००००	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	५० प्रतिशत
37	धमल्याङ देखि मल्लासेन सम्म खडन्ची बाटो निर्माण	६		१०००००	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	५० प्रतिशत
38	दमैनुङ खडन्ची बाटो निर्माण	६		१०००००	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	५० प्रतिशत
39	वडा कार्यालय फिल्ड निर्माण	६		२६३६४१	२०७९।८।१९	२०७९।११।३०	५० प्रतिशत
		६		२०००००	२०७९।८।२०	२०७९।११।३१	५० प्रतिशत
जम्मा भुक्तानी हुने रकम					४१२७८२०		

समस्या तथा चुनौतीहरू

१	योजना संचालन गर्दा प्रकृत्यामा ठूटो हुँदा संचालनमा ढीलाइ
२	आर्थिक कारोवारमा ढीलाइ हुँदा प्रगती नदेखिएको

समस्याको समाधानका उपायहरू

१	प्रकृत्या सच्याएर काम संचालन गरिएको ।
२	आर्थिक कारोवार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर पुगेपछि आर्थिक कारोवार सुरु भएको ।

Handwritten signature
रोजगार संयोजक

अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमका योजनाहरु

क्र.स	योजना को नाम	वडा न.	रकम रु	कैफियत
१	पडरखोला पि.सि.सि.बाटो निर्माण	१	२,००,०००/-	उ.स.गठन
२	ल्लाथी पि.सि.सि.बाटो निर्माण	१	३,३४,०००/-	उ.स.गठन
३	पाटु भलिबल फिल्ड निर्माण	२	१,२५,६७४/-	उ.स.गठन
४	टरे खोला देखि खोलागाँउ माथि सम्म खडन्ची बाटो	२	१,२१,६२०/-	उ.स.गठन
५	दैमात गाउँघर खडन्ची बाटो निर्माण	२	१,०१,३५०/-	उ.स.गठन
६	सकार खडन्ची बाटो निर्माण	२	५६,७५६/-	उ.स.गठन
७	भाडीडाँडा हुँदै दुइयारी रिनरोड खडन्ची बाटो निर्माण	२	३,४४,५९०/-	उ.स.गठन
८	कल्भेट(सन्तर खोला,रंघाडी,गरौंथी,छडे खोला,ठग डाडा)	३	२,५०,०००	उ.स.गठन
९	काटै पि.सि.सि.बाटो निर्माण	३	३,००,०००/-	उ.स.गठन
१०	चौड भिरमा जाली लगाउने कार्य	३	१,००,०००/-	उ.स.गठन
११	खिसा पि.सि.सि.बाटो निर्माण	३	१,५०,०००/-	उ.स.गठन
१२	क्षेती पि.सि.सि.बाटो निर्माण	३	१,५०,०००/-	उ.स.गठन
१३	शुर्मा भवानी आ.वि.घेर पर्खाल	३	प्राविधिक मूल्याङकनको	उ.स.गठन
१४	माल्मा काठे पुल निर्माण	३	५०,०००/-	उ.स.गठन
१५	लम्थाङ पि.सि.सि.बाटो निर्माण	४	२००,०००/-	सम्झौता कार्य
१६	खाती पानीधार प्लाष्टर	४	१,२५,०००/-	सम्झौता कार्य
१७	छयाङपाङ पि.सि.सि.बाटो निर्माण	४	२,७५,०००/-	उ.स.गठन
१८	खण्डेश्वरी बथिङसेन्टर मर्मत,व्यवस्थापन	४	२,००,०००/-	उ.स.गठन
१९	नौपाटा -सल्ली पि.सि.सि.बाटो	४	२,००,०००	सम्झौता कार्य
२०	सौगन्ना खडन्ची,पि.सि.सि.बाटो निर्माण	५	६,००,०००/-	उ.स.गठन
२१	रङ्गपङ लटबाग मन्दिर निर्माण	६	२,००,०००/-	उ.स.गठन
२२	काकानाडी घट्ट निर्माण	६	१,००,०००/-	उ.स.गठन
२३	धडकड घट्ट निर्माण	६	१,००,०००/-	उ.स.गठन
२४	रिगुर घट्ट निर्माण	६	१,००,०००/-	उ.स.गठन
२५	सेलेखोला काठेपुल निर्माण	६	१,००,०००/-	उ.स.गठन
२६	देउली खडन्ची बाटो निर्माण	६	१,००,०००/-	उ.स.गठन
२७	फिर्पाट वाल सहितको बाटो निर्माण	६	१,००,०००/-	उ.स.गठन
२८	वडा कार्यालय फिल्ड निर्माण	६	१,१६,०००/-	उ.स.गठन


रोजगार संगोजक

राजस्व शाखा बाट २०७९ फागुन महिनामा भएको कार्य प्रगती विवरण:

१. माघ मसान्त सम्मको राजस्व रकम रु.५९६०७२.५

२. ~~थप~~ महिनाको गा.पा.को राजस्व रकम रु.५६००/-

क) व्यवसाय दर्ता दस्तुर-रु.२०००

ख) खानेपानी योजना उपभोक्ता समिति नविकरण तथा प्रतिलिपि:२०००

ग) अन्य:रु.१६००

समस्या तथा चुनौतीहरु:

१. करको दायरा बढाउनुपर्ने ।

२. राजस्व सुधार योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुनु ।

३. वडा कार्यालयहरु बाट मासिक रूपमा राजस्व दाखिला नहुनु ।

प्रेमजित

देवपति कोशी
०७५/१९२/०८
२९/९/१९

अपिहिमाल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खण्डेश्वरी, दाचुवा
अपिहिमाल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खण्डेश्वरी, दाचुवा
आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण

मिति देखी
नियमित सेवाहरु

०१/११/२०७९ मिति सम्म

११/३०/२०७९

क्र.स	सेवाहरु	गत महिना सम्म जम्मा	सेवाग्राहि संख्या	कैफियत
१	सिफारिस	९ वटा	९ जना	
२	गुनासो तथा उजुरी			
३	पत्र तथा निवेदनहरु दर्ता	५ वटा		
४	पत्र तथा निवेदनहरु चलानि	११ वटा	७ जना	
५				
६				

राजश्व संकलन

क्र.स	सेवाहरु	गत महिना सम्म जम्मा	सेवाग्राहि संख्या	जम्मा राजश्व रकम	कैफियत
१	भुमिकर/मालपोत	रु ४१६७	३४ जना	रु ४१६९	
२	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर				
३	घरवहाल कर				
४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	रु १८००	९ जना	रु १८००	
५	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क (न्यायिक, परिक्षा, टेक्का,)				
६	सिफारिश दस्तुर	रु ५००	३ जना	रु ५००	
७	नाता प्रमाणित दस्तुर				

८ अन्य दस्तुर(दर्ता, इजाजतपत्र)				
९ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर				
११ व्यवसाय कर	रु१७०००	४जना	रु१७०००	
१२ दण्ड, जरिवाना र वाफत				
१३ अन्य कराघर कर	रु ६७९६	३३जना	रु ६७९६	
जम्मा रु ३०१६१।				

घटना दर्ता

क्र.स	सेवाहरु	गत महिना सम्म जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१	जन्म दर्ता	५ वटा	४ जना	१ जना	५जना	
२	मृत्यु दर्ता	२ वटा	२ जना		२जना	
३	विवाह दर्ता					
४	बसाइ सराई		क			
५	सम्बन्ध विच्छेद					
६	पुर्ण अपाङ्गता दर्ता					
७	आंशिक अपाङ्गता दर्ता					

सामाजिक सुरक्षा

क्र.स	सेवाहरु	गत महिना सम्म जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१	जेष्ठ नागरीक	२१ जना	९जना	१२ जना	२१ जना	
२	एकल महिला					
३	पुर्ण अपाङ्गता	१जना	१जना		१जना	मृत्यु भएको
४	आंशिक अपाङ्गता	४जना	२ जना	२जना	४जना	
जम्मा		२६ जना	१२ जना	१४ जना	२६ जना	

समस्या तथा चुनौतीहरु

१	
---	--

२	
३	
४	
<u>समस्याको समाधानका उपयाहरु</u>	

अपिहिमाल गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

खण्डेश्वरी, दाचुला ।

आ.व. २०७९/०८० को मासिक प्रगति विवरण

वडा नं. १

फागुन महिनाको

नियमित सेवाहरु

क्र.स	सेवाहरु	सेवाग्राहि संख्या	कैफियत
१.	सिफारिस	२४	
२.	गुनासो तथा उजुरी		
३.	पत्र तथा निवेदनहरु दर्ता	१४४ देखि २५२	१४४ दर्ता
४.	पत्र तथा निवेदनहरु चलानि	१२१ देखि १५४	३३ चलानि
५.			
६.			

राजश्व संकलन

क्र.स	सेवाहरु	सेवाग्राहि संख्या	जम्मा राजश्व रकम	कैफियत
१.	भूमिकर /मालपोत	८८	रु. १४,०१४	
२.	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर			
३.	घरवहाल कर	१	रु. ४२,०००	
४.	घर कर वाफत	७३	रु. ९४२५	
५.	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१	रु. १००	
६.	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क -न्यायिक ,परिक्षा,ठेक्का)			
७.	सिफारिस दस्तुर	३	रु. ३,२००	
८.	नाता प्रमाणित दस्तुर	१	रु. ५००	
९.	अन्य दस्तुर (दर्ता , इजाजतपत्र)			
१०.	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर			
११.	व्यवसाय कर	३	रु. ११,०००	
१२.	दण्ड , जरिवाना वाफत			
१३.	अन्य कर	२	रु. ६०,१००	जम्मा १०५५
जम्मा रकम			रु. १४०,३३९	

[Handwritten Signature]
११/१२/२०

घटना दर्ता

क्र.स	सेवाहरु	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१	जन्म दर्ता	१		१	
२	मृत्यु दर्ता				
३	विवाह दर्ता				
४	बसाइ सराई				
५	सम्बन्ध विच्छेद				
६	पूर्ण अपाङ्गता दर्ता				
७	आशिक अपाङ्गता दर्ता				

सामाजिक सुरक्षा

क्र.स	सेवाहरु	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१	जेष्ट नागरिक	१३	२४	३७	
२	एकल महिला	२		२	
३	पूर्ण अपाङ्गता	१		१	
४	आशिक अपाङ्गता	६	३	९	

समस्या तथा चुनौतीहरु	
१	
२	
समस्याको समाधानका उपायाहरु	
१	
२	

वडा कार्यलय बाट गरिएका सेवाहरु

- आधारभुत स्वास्थ्य सितिमा खानेपानी पाईप र इन्भटर सहित को सोलार उपलब्ध
- भवानी आ.वि. सितिमा नारी दिवस सञ्चालन

वृद्धि प्राप्त ३६० कोट (छाडक) कोट
 १०० एडवेट १/४


(Signature)
 ०६/१२/०८

अपिहिमाल गाँउपालिका १ नं. वडा सिति

योजनाहरुको कार्य सम्बन्धि

प्रगति विवरण

फाल्गुन महिनाको



तयार पार्ने :

नाम : रामा लोथ्याल

पद : वडा अ.स.ई

मिति : २०७९/१२/०१

प्रमाणित गर्ने :

नाम : अगबर सिंह जागरी

पद : वडा सचिव

मिति : २०७९/१२/०१

अपिहिमाल गाउँपालिका १ नं. वडा अन्तरगत
अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम

१. ल्वाथी पि.सि.सि बाटो निर्माण :


स्थान : अपिहिमाल १ ल्वाथी

निर्माण कार्य : काम संचालन भएको सम्पन्न हुन बाँकी

२. पाडरखोला पि.सि.सि बाटो निर्माण :

स्थान : अपिहिमाल १ ल्वाथी

निर्माण कार्य : काम संचालन हुन बाँकी


06/07/20

६. भट्टार रातापानि वृक्षारोपण :

स्थान : १ नं. वडा भट्टार

निर्माण कार्य : सम्भौता भएको काम संचालन हुन बाँकी

७. भवानि आ.वि २ कोठे भवन :

स्थान : १ नं. वडा सिति

निर्माण कार्य : सम्पन्न भएको भुक्तानि बाँकी

८. पर्यटन आराम आसय निर्माण योजना :

स्थान : १ नं. वडा अपि

निर्माण कार्य : सम्पन्न भएको भुक्तानि बाँकी

१. धल्देउ मन्दिर निर्माण योजना :

स्थान : १ नं. वडा लुम्चा

निर्माण कार्य : सम्पन्न भएको भुक्तानि बाँकी

२. लटिनाथ मन्दिर निर्माण :

स्थान : १ नं. आरुखोड

निर्माण कार्य : सम्पन्न भएको भुक्तानि बाँकी

३. महादेव मन्दिर निर्माण :

स्थान : १ नं. वडा सिति

निर्माण कार्य : सम्पन्न भएको भुक्तानि बाँकी

४. आरुखोड ढलनिकास निर्माण :

स्थान : १ नं. आरुखोड

निर्माण कार्य : सम्पन्न भएको भुक्तानि बाँकी

५. गुरुसाड पाईप ढलनिकास :

स्थान : १ नं. वडा गुरुसाड

निर्माण कार्य : सम्पन्न भएको भुक्तानि बाँकी

अपिहिमाल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खण्डेश्वरी, दाचुला ।

आ.व. २०७९/०८० को मासिक प्रगति विवरण

वडा नं. १

फागुन महिनाको

नियमित सेवाहरु

क्र.स	सेवाहरु	सेवाग्राहि संख्या	कैफियत
१.	सिफारिस	२४	
२.	गुनासो तथा उजुरी		
३.	पत्र तथा निवेदनहरु दर्ता	१४४ देखि २५२	१४४ दर्ता
४.	पत्र तथा निवेदनहरु चलानि	१२१ देखि १५४	३३ चलानि
५.			
६.			

राजश्व संकलन

क्र.स	सेवाहरु	सेवाग्राहि संख्या	जम्मा राजश्व रकम	कैफियत
१.	भूमिकर / मालपोत	८८	रु. १४,०१४	
२.	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर			
३.	घरवहाल कर	१	रु. ४२,०००	
४.	घर कर वाफत	७३	रु. ९४२५	
५.	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१	रु. १००	
६.	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क -न्यायिक ,परिक्षा,ठेक्का)			
७.	सिफारिस दस्तुर	३	रु. ३,२००	
८.	नाता प्रमाणित दस्तुर	१	रु. ५००	
९.	अन्य दस्तुर (दर्ता , इजाजतपत्र)			
१०.	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर			
११.	व्यवसाय कर	३	रु. ११,०००	
१२.	दण्ड , जरिवाना वाफत			
१३.	अन्य कर	२	रु. ६०,१००	
जम्मा रकम			रु. १४०,३३९	अंकित १०३५


१२/०८

घटना दर्ता



क्र.स	सेवाहरु	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१	जन्म दर्ता	१		१	
२	मृत्यु दर्ता				
३	विवाह दर्ता				
४	बसाइ सराई				
५	सम्बन्ध विच्छेद				
६	पूर्ण अपाङ्गता दर्ता				
७	आशिक अपाङ्गता दर्ता				

सामाजिक सुरक्षा

क्र.स	सेवाहरु	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१	जेष्ठ नागरिक	१३	२४	३७	
२	एकल महिला	२		२	
३	पूर्ण अपाङ्गता	१		१	
४	आशिक अपाङ्गता	६	३	९	

समस्या तथा चुनौतीहरु	
१	
२	
समस्याको समाधानका उपायाहरु	
१	
२	

वडा कार्यलय बाट गरिएका सेवाहरु

- आधारभुत स्वास्थ्य सितिमा खानेपानी पाईप र इन्भटर सहित को सोलार उपलब्ध
- भवानी आ.वि. सितिमा नारी दिवस सञ्चालन

वृद्धि प्राप्त ३६० कोट (६५३६) कोट
१०० एडवेट १/४

०६/१२/०८



आ.व. २०७९/८० को मासिक प्रगति विवरण

वडा नं:४

मिति देखी

नियमित सेवाहरु

१९/०९/२०७९ मिति सम्म

१९/३०/२०७९

क्र.सं	सेवाहरु	गत महिना सम्म जम्मा	यस महिनाको जम्मा	सेवाग्राहि संख्या	कैफियत
१	सिफारिस	२७३	४०	३१३	
२	मुनासो तथा उजूरी	०	०	०	
३	पत्र तथा निवेदनहरु दर्ता	२५८	२०१	५२९	
४	पत्र तथा निवेदनहरु चलानि	४२५	५८	३३०	
५					
६					

राजश्व संकलन

क्र.सं	सेवाहरु	गत महिना सम्म जम्मा	यस महिनाको जम्मा	सेवाग्राहि संख्या	जम्मा राजश्व रकम	कैफियत
१	भुमिकर/मालपोत	४९२१-	०	३ जना	४९२१-	
२	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	०	०	०	०	
३	घरवहाल कर	०	०	०	०	
४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	५,०००-	५,६००-	५५ जना	१०,६००-	
५	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क(न्यायिक,परिक्षा, ठेक्का.)	४००-	०	४ जना	४००-	
६	सिफारिश दस्तुर	१७,२५०-	१,४००-	१३६ जना	१८,६५०-	

ब॥ ६
दुर्गा सिंह
वडा सचिव

७ नाता प्रमाणित दस्तुर	५,१००/-	१,५००/-	२१ जना	६,६००/-	
८ अन्य दस्तुर (दर्ता, इजाजतपत्र)	५,६५०/-	०	११	५,६५०/-	
९ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१,०००/-	१,०००/-	२ जना	२,०००/-	
११ व्यवसाय कर	३९,३००/-	५,०००/-	६ जना	४४,३००/-	
१२ दण्ड, जरिवाना र वाफत	०	०	०	०	
१३ अन्य कर	६,२५०/-	४,६००/-	८ जना	१०,८५०/-	
जम्मा: १९,१००/- (उन्नाईस हजार एक सय मात्रा-)				९९,५४२/-	

घटना दर्ता

क्र.स	सेवाहरु	गत महिना सम्म जम्मा	यस महिनाको जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१	जन्म दर्ता	१० जना	३ जना	१ जना	२ जना	१३ जना	
२	मृत्यु दर्ता	४ जना	१ जना	१ जना		५ जना	
३	विवाह दर्ता	३ जोडी	०	०	०	३ जोडी	
४	बसाइ सराई	३ जना	०	०	०	३ जना	
५	सम्बन्ध विच्छेद	०	०	०	०	०	
६	पूर्ण अपाङ्गता दर्ता	०	०	०	०	०	
७	आंशिक अपाङ्गता दर्ता	०	०	०	०	०	

सामाजिक सुरक्षा

क्र.स	सेवाहरु	गत महिना सम्म जम्मा	यस महिनाको जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१	जेष्ठ नागरीक	७९ जना	१ जना	४२ जना	३८ जना	८० जना	
२	एकल महिला	१० जना	०	१० जना	०	१० जना	
३	पूर्ण अपाङ्गता	३ जना	०	२ जना	१ जना	३ जना	
४	आंशिक अपाङ्गता	१४ जना	०	८ जना	६ जना	१४ जना	
जम्मा		१०६ जना	१ जना	६२ जना	४५ जना	१०७ जना	

डा. दुर्गा सिंह
वडा सचिव

समस्या तथा चुनौतीहरू

१

२

३

४

समस्याको समाधानका उपयाहरू


डा॥ ६९
दुर्गा सिंह
वडा सचिव

अपिहिमाल गाउँपालिका २ नं वडामा फागुन महिना भरीमा गरिएका कामहरू:-

क्र.स.	योजनाको नाम	स्थान	कार्य प्रगती	विनियोजित रकम	कैफियत
१	घट्टेखोला आर.सि.सि. पुल	घुसा	१००%	३०००००	
२	साकार मन्दिर निर्माण	साकार	१००%	१५००००	
३	दैभात पि.सि.सि बाटो	दैभात	१००%	२०००००	
४	मालपोतको कार्य गरियो				
५	योजनाको अनुगमन गरियो				
६	अन्य कार्यलयका कामहरू				

- ७) कृषि अन्तर्गत आगेका को वितरण
 ८) कृषि अन्तर्गत रूखाउको को वितरण
 ९) वडा अन्तर्गत जेष्ठ नगरपालिका ~~अन्तर्गत~~ न्यानो कमल वितरणमा सहयोग
 १०) अ.स.व. २०७७/७९ को लागि सै प्रयातमन्त्री खोपगार काएक भएरियो

तयार पार्ने:- जयप्रकाश लोथ्याल
 वडा प्राविधिक
 अ.स.व-इन्जिनियर


 प्रमाणित गर्ने: अगबल सिंह आगरी
 वडा सचिव

अपिहिमाल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खण्डेश्वरी, दार्चुला

आ.व. २०७९/८० को मासिक प्रगति विवरण
चडा नः२

मिति २०७९/११/०१ देखि
नियमित सेवाहरु

२०७९/११/३० गते सम्म

क्र.स	सेवाहरु	गत महिना सम्म जम्मा	सेवाग्राहि संख्या	कैफियत
१	सिफारिस	४५	४५	
२	गुनासो तथा उजुरी	०	०	
३	पत्र तथा निवेदनहरु दर्ता	१	१	
४	पत्र तथा निवेदनहरु चलानि	४५		
५				
६				

राजस्व संकलन

क्र.स	सेवाहरु	गत महिना सम्म जम्मा	सेवाग्राहि संख्या	जम्मा राजस्व रकम
१	भूमिकर/मालपोत	१०७	१०७	१८७२०.५
२	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर			
३	घरवहाल कर	८६	८६	१२४७५
४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	३	३	३००
५	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क(न्यायिक,परिक्षा, ठेक्का,)			
६	सिफारिश दस्तुर	२	२	२००
७	नाता प्रमाणित दस्तुर			
८	अन्य दस्तुर(दर्ता, इजाजतपत्र)			
९	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर			
११	व्यवसाय कर			
१२	दण्ड, ज़रिवाना र वाफत			
१३	घट्ट कर	३	३	१२५
जम्मा				

घटना दर्ता

क्र.स	सेवाहरु	गत महिना सम्म जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१	जन्म दर्ता	३	१	२	३००	
२	मृत्यु दर्ता	०	०	०		
३	विवाह दर्ता	१	१	१	१००	
४	बसाइ सराई	०	०	०		
५	सम्बन्ध विच्छेद	०	०	०		
६	पुर्ण अपाङ्गता दर्ता	०	०	०		
७	आंशिक अपाङ्गता दर्ता	०	०	०		

सामाजिक सुरक्षा

क्र.स	सेवाहरु	गत महिना सम्म जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१	जोड नागरीक	५४	३०	२४	५४	
२	एकल महिला	२९	२९	०	२९	
३	पूर्ण अपाङ्गता	०	०	०		
४	आंशिक अपाङ्गता	३	२	१	३	
जम्मा						

तयार पार्ने : 
अध्यक्ष लोचमाल
वडा अधिकारी

जमा गरिने रकम : अगबल सिंह पाण्डे 
वडा सचिव

		समस्या तथा चुनौतीहरू
१	तालिम संचालन गर्दा भौगोलिक विकटताले सहभागि आउनमा ढिला हुने।	
२		
३		
४		

		समस्याको समाधानका उपयाहरू
तालिम संचालन गर्दा सम्बन्धित बडभा तालिम संचालन गर्दा ठिक हुने।		

नाम धर्मानन्द शर्मा
उपम विकास सहकर्ता
उद्योग विकास शाखा
अधिकारालय गा पा

D. W. Shrestha
