



Co-funded by
the European Union




**SUOMI
FINLAND**

अपिहिमाल गाउँपालिका, खण्डेश्वरी, दार्चुला जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०८२/८३

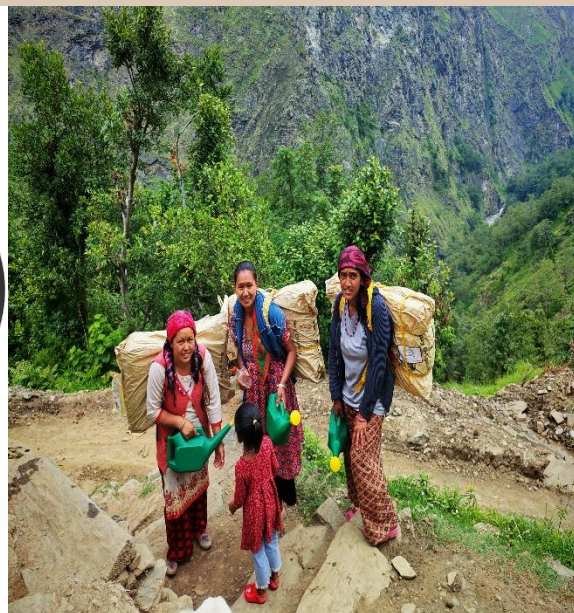

अपिहिमाल गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, खण्डेश्वरी, दार्चुला



विषयसूची

क. आर्थिक प्रगतिको सारांश	३
ख. भौतिक प्रगतिको सारांश	४
नतिजा १: जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन तथा भू पारिस्थितिक प्रणालीको समावेशी व्यवस्थापन र संरक्षण	४
नतिजा २: समावेशी र दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन अभ्यासको सबलीकरण	४
नतिजा ३: प्रदेश र स्थानीय स्तरमा दिगो, समावेशी र एकीकृत प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अनुकूल हुने अवस्था र शासन प्रणाली.....	५
१. पृष्ठभूमि	६
२. लक्ष्य बमोजिम उपलब्धी.....	७
२.१ लक्ष्य र प्रगतिको सारांश	७
जलवायु उत्थानशील सिंचाइ/खानेपानी/बहुपयोगी आयोजना सम्बन्धि क्रियाकलापहरू:	७
जलवायु उत्थानशील कृषि तथा कृषिवन सम्बन्धि क्रियाकलापहरू:	८
.....	८
सुधारिएको घट्ट तथा चुलो सम्बन्धि क्रियाकलापहरू:	८
२.२ भौतिक प्रगति.....	९
२.२ क्षमता विकास	१४
२.३ जलवायु उत्थानशील कृषि तथा कृषिवन क्रियाकलाप	१५
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	१७
४. प्रगति समिक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	१९
५. परियोजना सँग सम्बन्धित स्थानीय तहका ऐन, नियम, नियमावली, रणनीति, तथा योजना सम्बन्धी क्रियाकलापहरू	१९
६. परियोजनाका अन्तरसम्बन्धित उद्देश्यसँग सम्बन्धित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू	२०
६.१ लैङ्गिक समानता तथा भेदभाव रहित र अपाङ्गता समावेशीकरण	२०
६.२ जलवायु उत्थानशीलता मुलप्रवाहिकरण	२०
६.३ न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास प्रवर्द्धन	२०
६.४ जैविक विविधता र वातावरणको संरक्षण.....	२०
७. सहकार्य	२०
८. आगामी आर्थिक वर्षका लागि परियोजना तर्फका प्रमुख प्राथमिकताहरू र समपुरक बजेटको व्यवस्था.....	२१
९. सिकाई, चुनौती तथा समस्याहरू	२१
अनुसूची ३: अपिहिमाल पालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू.....	२३


तालिकाहरू

तालिका १ गाउँपालिका स्तरमा सम्पन्न गरिएका दिवसहरूको विवरण.....	५
तालिका २ क्षेत्रगत समग्र भौतिक प्रगति.....	९
तालिका ३ यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी:.....	१२
तालिका ४ यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरू.....	१३
तालिका ५ लक्ष्य बमोजिम भौतिक उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुको कारण.....	१४
तालिका ६ दिगो कृषि, भूमि र वन व्यवस्थापन अभ्यासहरू गर्न तालिम सहभागीको विवरण सारांश.....	१४
तालिका ७ जलवायु उत्थानशील कृषि तथा कृषिवन प्रविधि सम्बन्धि क्रियाकलाप गर्ने घरधुरी विवरण.....	१५
तालिका ८ दिगो उत्पादन, आयआर्जन र बजारमा पहुँच बढाएका घरधुरीहरू सम्बन्धी विवरण.....	१५
तालिका ९ उपभोक्ता समिति सम्बन्धी विवरण.....	१५
तालिका १० जलवायु उत्थानशील, दिगो जलस्रोत र समावेशी व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम सहभागी विवरण सारांश.....	१७
तालिका ११ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास सम्बन्धि विवरण सारांश.....	१७
तालिका १२ परियोजना अन्तर्गत सन्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन विवरण.....	१७
तालिका १३ अपिहिमाल गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू.....	१८
तालिका १४ अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन विवरण.....	१८
तालिका १५ अपिहिमाल गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक.....	१९
तालिका १६ : परियोजना कार्यान्वयन एकाइको द्वैमासिक/अर्धवार्षिक योजना तर्जुमा तथा प्रगति समीक्षा बैठक.....	१९
तालिका १७ परियोजनासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य.....	२०
तालिका १८ समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयास तथा उपायहरू.....	२२




क. आर्थिक प्रगतिको सारांश

प्रतिवेदनको समयावधि:	०१ बैशाख २०८३ देखि ३१ आषाढ २०८३				
आर्थिक प्रगति सारांश					
परियोजनाको लागि यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था(रु. हजारमा)(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	शीर्षक	वार्षिक बजेट	निकासा	खर्च	खर्च प्रतिशत
	पूँजीगत:	२५८०१।००	२११६१।२१४	१७६०४।७२६	६८%
	कार्यक्रम/चालु:	५३४९।००	४१८३।६२०	२५१७।९७६	४७%
	जम्मा:	३११५०।००	२५३४४।८३४	२०१२२।७०१	६५%
स्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा)	लगानीको स्रोत	वार्षिक बजेट	निकासा	खर्च	खर्च प्रतिशत
	स्थानीय तह	८०५०।००	२८९५।८३४	२८९५।८३४	३६%
	नेपाल सरकार	३५७०।-	३५७०।-	३५७०।-	१००%
	फिनल्याण्ड सरकार र इयू (GoF+EU)	१९५३०।-	१८८७८।००	१३६५६।८६७	७०%
	जम्मा (NRDF):	३११५०।-	२५३४४।८३४	२०१२२।७०१	६५%
	उपभोक्ताको नगद (Cash)	५६।४६०	४६।१३९	४६।१३९	८२%
	उपभोक्ताको जनश्रमदान (Kind)	५५८९।५४०	४५६७।७८९	४५६७।७८९	८२%
	जम्मा (उपभोक्ता):	५६४६।००	४६१३।९२७	४६१३।९२७	८२%
	कुल जम्मा:	३६७९६।००	२९९५८।७६१	२४७३६।६२९	६७%

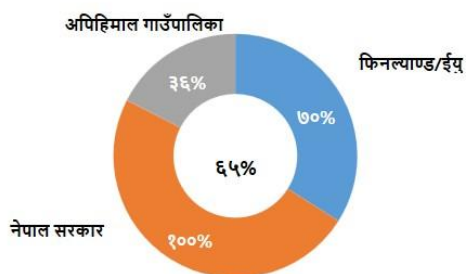

वित्तिय प्रगति (वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा)

३ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८२/०८३

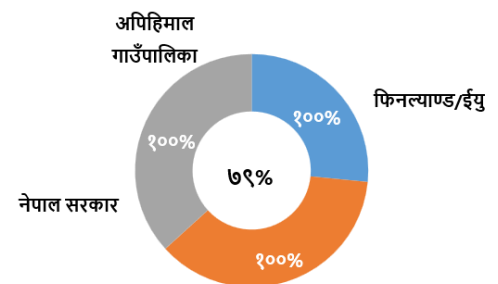

वित्तिय प्रगति (निकासाका आधारमा)



लोकेन्द्र बहादुर विष्ट
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ख. भौतिक प्रगतिको सारांश

नतिजा १: जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन तथा भू पारिस्थितिक प्रणालीको समावेशी व्यवस्थापन र संरक्षण

क्षेत्र	आ.व. २०८२।० ८३ को लक्ष्य	आ.व. २०८२।० ८३ को प्रगति	परियोजनाको हालसम्मको उपलब्धि
आयोजनाहरू (Schemes):			
जलवायु उत्थानशील सिंचाइ आयोजना (नहर कुलो)	२	१	१ क्रमागत
जलवायु उत्थानशील सिंचाइ आयोजना (सौर्य तथा विद्युतीय लिफ्ट)	-	-	-
जलवायु उत्थानशील सिंचाइ आयोजना (लघु (माइक्रो) तथा आधुनिक सिंचाइ))	-	-	-
सुधारिएको चुल्हो आयोजना (माटोको चुल्हो, फलामको चुल्हो)	२	२	२
सुधारिएको पानी घट्ट आयोजना	२	२	२
जलवायु उत्थानशील कृषि तथा कृषि वन सहकारी सम्बन्धि आयोजना	८	२	२
जलवायु उत्थानशील कृषि वन सम्बन्धि आयोजना			
बायोइन्जिनियरिंग आयोजना	१	१	१
प्रकृतिमा आधारित समाधान (NbS) योजनाहरू (वातावरण संरक्षण गर्न पहिरो/बाढी न्यूनीकरण (तटबन्ध, पहिरो सुधार स्थिरीकरण आदि) आयोजना	-	-	-
वन समुहहरू तथा प्राकृतिक स्रोत दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धि आयोजना	२	२	२
तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू:			
सिंचाइ आयोजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	६	६	६
सुधारिएको घट्ट/चुलो निर्माण योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	३	३	३
प्राकृतीमा आधारित समाधान, जोखिम न्युनिकरण/व्यवस्थापन तथा बायोइन्जिनियरिङ्ग सम्बन्धित क्षमता विकास तालिम/गोष्ठी/ अनुशिक्षणहरू	३	३	३

नतिजा २: समावेशी र दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन अभ्यासको सबलीकरण

क्षेत्र	आ.व. २०८२।०८३ को लक्ष्य	आ.व. २०८२।०८३ को प्रगति	परियोजनाको हालसम्मको उपलब्धि
आयोजनाहरू (Schemes):			
खानेपानी नयाँ आयोजना			
ग्राभिटी	३	१	निर्माणाधिन ७५ %
सौर्य तथा विद्युतीय लिफ्ट			
खानेपानी पुनःस्थापना आयोजना			
ग्राभिटी	-	-	-
सौर्य तथा विद्युतीय लिफ्ट	-	-	-

बहुउपयोगी आयोजना	-	-	-
ग्राभिटी	-	-	-
सौर्य तथा विद्युतीय लिफ्ट	-	-	-
संस्थागत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना			
जलवायु मैत्री विद्यालय खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	४	४	४
समुदायस्तर पूर्ण सरसफाइ आयोजना	-	-	-
जलवायु उत्थानशील खानेपानी सुरक्षा योजना लागु भएका आयोजना	-	-	-
पानीको स्रोत संरक्षण, ताल र पोखरी संरक्षण, पानी भण्डारण/पुनर्भरण पोखरी, वर्षाको पानी संकलन आयोजना	१	२	२
दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन अभ्यास सम्बन्धि आयोजना	-	-	-
तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु:			
खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	२१	२०	२०

नतिजा ३: प्रदेश र स्थानीय स्तरमा दिगो, समावेशी र एकीकृत प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अनुकूल हुने अवस्था र शासन प्रणाली

क्षमता विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांश:

- ✦ पालिकास्तरीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुको सहभागितामा २ दिने लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा जलवायु उत्तरदायी बजेटसम्बन्धी क्षमता विकास कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरियो।
- ✦ पालिकास्तरीय स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय, प्राविधिक विज्ञ तथा समुदायका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा २ दिने N-WASH तथ्यांक प्रमाणीकरण, प्राथमिकीकरण तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गरियो।
- ✦ परियोजना सहयोग इकाई (PSU), सुर्खेतको समन्वय तथा सहजीकरणमा पूर्वाधार शाखामा कार्यरत प्राविधिकलाई डडेल्धुरामा ५ दिने योजना लागत इस्टिमेट तयारी तथा सर्वे उपकरण प्रयोगसम्बन्धी तालिम र कृषि शाखाका नाप्रसलाई मूल्य श्रृंखलासम्बन्धी अनुशिक्षण तालिम सम्पन्न गरियो।
- ✦ प्राविधिक सहयोग इकाई, दार्चुलाको समन्वय तथा सहजीकरणमा परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई ३ दिने परियोजना अभिमुखीकरण, योजना लागत इस्टिमेट तयारी तथा सर्वे उपकरण प्रयोगसम्बन्धी अनुशिक्षण तालिम सम्पन्न गरियो।
- ✦ पालिकाका जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरु विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरी मनाइयो। दिवसहरुको विवरण तल तालिकामा राखिएको छ।


तालिका १ गाउँपालिका स्तरमा सम्पन्न गरिएका दिवसहरुको विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	सहभागी			दिवस मनाईको स्थान/क्षेत्र
		म.	पु.	जम्मा	
१	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस	४६	१८	६४	चौविसन पाइप सिचाइ योजना स्तरमा
२	विश्व पानी दिवस	३९	१७	५६	चिल्डुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना स्तरमा
३	राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह	१०८	३६	१४४	पालिका तथा समुदाय स्तरमा
४	विश्व वातावरण दिवस	३१	५१	८२	श्री खण्डेश्वरी मा.वि. क्षेत्री, दार्चुला (विद्यालय स्तरमा)

आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना, नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकार विचको द्विपक्षिय सम्झौता अनुसार संचालित परियोजना हो । यस परियोजनाले नेपालको कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४१ वटा पालिकाहरूमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र उत्थानशीलता एकीकृत जल भू-उपयोग योजना र व्यवस्थापन विषय जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारी, तथा वन स्रोत व्यवस्थापन तावरण संरक्षण तथा स्थानीय शासनन र लैङ्गिक समाअपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशिकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

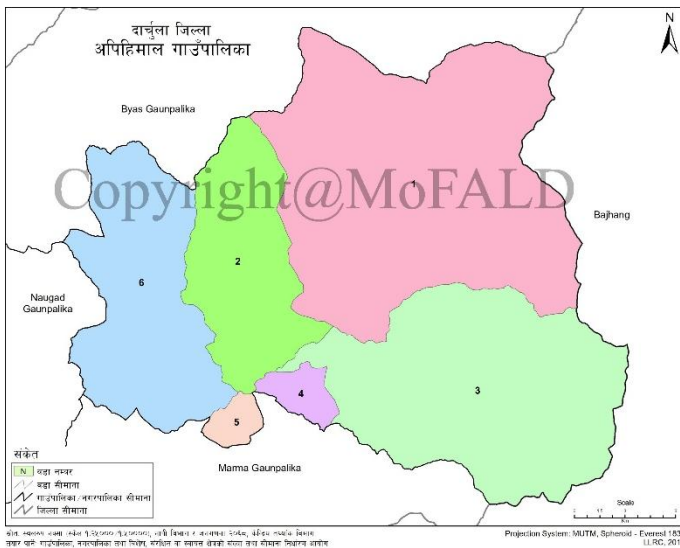

अपिहिमाल गाउँपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल ६१३.९५ वर्ग कि मि रहेको छ भने २०७८ को जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार पालिकामा ६,७७९ जनसंख्या बसोबास गर्दछन् । गाउँपालिकामा जम्मा ६ वडा रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा बाह्रान, क्षेत्री, जनजाती, दलित समुदायहरूको मुख्य बसोबास रहेको छ ।

अपिहिमाल गाउँपालिकामा फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा लामो समय देखि खानेपानीका क्षेत्रमा योजना तथा कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आएको छ । साविकका सितोला गाउँ विकास समिति (हालको वडा नं. ६) मा RVWRMP-I ले विभिन्न खानेपानी योजना तथा क्रियाकलापमा साझेदारी गरेको थियो भने RVWRMP-II मा साविकको सितोला र गुल्जर गाउँ विकास समिति

(हालको वडा नं. ६ र ५) मा फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा कार्यक्रम संचालन गरिएका थिए भने नेपाल सरकार, फिनल्याण्ड/ईयु र अपिहिमाल गाउँपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा RVWRMP-III लागु गरिएको थियो । RVWRMP-III को सफलता पश्चात लागु गरिएको जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना दोस्रो वर्ष सफल कार्यान्वयन गरिएको छ ।

यस परियोजनाका परिणाम क्षेत्रहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

परिणाम क्षेत्र १ जलवायु उत्थानशील र समावेशी जीविकोपार्जन तथा स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालीको व्यवस्थापन र संरक्षण :

- खाद्य सुरक्षा र आय वृद्धिको प्रवर्द्धन गर्न जलवायुवन प्रणाली अभ्यासहरू सशक्त हुने । -स्मार्ट कृषि तथा कृषि-
- प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोगलाई ऊर्जा स्रोतका रूपमा प्रवर्द्धन गरी विशेष गरी महिलाहरूको समय उपयोग दक्षता बढ्ने ।
- सबैको समान सहभागिता सहित भूमि, प्राकृतिक स्रोतहरू र पारिस्थितिकीय प्रणालीको व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्न समुदायहरू सक्षम र उत्प्रेरित हुने ।

परिणाम क्षेत्र २ सुदृढ समावेशी र दिगो : जल व्यवस्थापन अभ्यासहरू:

- समुदायहरू समान सहभागिता सहित नदी, खोलानाला-, ताल तलैया/, पानीका स्रोतहरू र भूमिगत जलको व्यवस्थापन र सुरक्षा गर्न सक्षम तथा प्रेरित हुने ।
- जलवायु उत्थानशील, सुरक्षित र सुचारु बहुउपयोगी पानी सेवा र पूर्ण सरसफाइ ।

परिणाम क्षेत्र ३ : प्रदेश र स्थानीय स्तरमा दिगो, समावेशी र एकीकृत प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि सबलिकरण हुने अवस्था र शासन प्रणाली:

- प्रभावकारी र समावेशी प्रादेशिक र स्थानीय शासन प्रणालीहरूले संघीय संरचना र समग्र योजना बनाउने कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
- सुदृढ क्षमता र सक्षम अवस्थाको लागि सम्बन्धित पक्षहरू निजी क्षेत्र), नागरिक समाजका सङ्गठनहरू, अधिकारधारक समूहहरू, शिक्षाविद्हरूसँग कुशल ज्ञान साझेदारी गर्ने र सम्बन्ध राख्ने।

अपिहिमाल गाउँपालिका, जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाको वार्षिक कार्य योजना बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा संचालित योजना/कार्यक्रमहरूको आर्थिक तथा भौतिक प्रगतिको दस्तावेजीकरणका लागि यो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।

२. लक्ष्य बमोजिम उपलब्धी

२.१ लक्ष्य र प्रगतिको सारांश

जलवायु उत्थानशील सिंचाइ/खानेपानी/बहुपयोगी आयोजना सम्बन्धि संचालन गरिएका प्रमुख क्रियाकलापहरू तपसिल बमोजिम रहेको छ।

जलवायु उत्थानशील सिंचाइ/खानेपानी/बहुपयोगी आयोजना सम्बन्धि क्रियाकलापहरू:

योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययनपश्चात् गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० बमोजिम सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित गरी योजना सञ्चालन क्षेत्रमा प्रारम्भिक भेला आयोजना गरियो। परियोजनाको निर्देशिका बमोजिम उपभोक्ता समिति गठन गरी उपलब्ध आधुनिक प्रविधि तथा DGPS सर्भे उपकरणमार्फत विस्तृत सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको थियो।

- ✦ परियोजनाको चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिम तालिम, गोष्ठी तथा अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिएको।
- ✦ उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूका लागि उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तथा बाह्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको।
- ✦ परियोजनाको सामुदायिक खरिद कार्यविधि, २०८२ बमोजिम बाह्य निर्माण सामग्री आपूर्ति गरिएको।
- ✦ ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तथा अगुवा कृषक छनोट गरी आवश्यक तालिम प्रदान गरिएको।



तस्विरमा चौविसन पाइप सिंचाइ योजना DGPS सर्भे



तस्विरमा घरायसी स्तरमा सुधारिएको चुलो सहयोग

- ✦ परियोजनाको निर्देशिका तथा मापदण्ड बमोजिम योजनास्तरीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिएको।
- ✦ महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिएको।






तस्विरमा वृक्षारोपण गर्दै स्थानीय महिला

जलवायु उत्थानशील कृषि तथा कृषिवन सम्बन्धि क्रियाकलापहरू:

- ✦ बहुउपयोगी फलफुल घाँसका विरुवा रोपण तथा संरक्षण कार्य गरेको ।
- ✦ कृषि उत्पादन, जीविकोपार्जन र जलवायु उत्थानशीलतामा समुदायको बढाव,

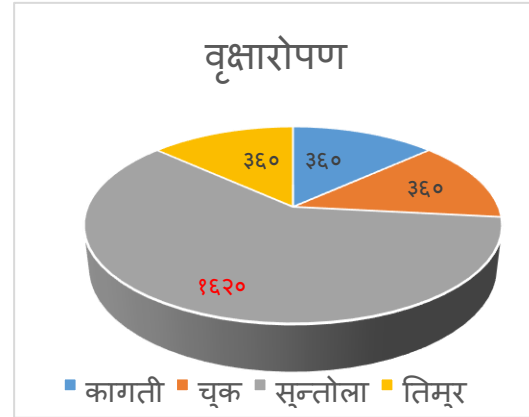

सुधारिएको घट्ट तथा चुलो सम्बन्धि क्रियाकलापहरू:

- ✦ न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास प्रवर्द्धन गर्न ११२ वटा घरधुरीहरूमा घरायसी स्तर सुधारिएको चुलो सहयोग योजना ।
- ✦ पालिकाको वडा नं. ३ को लुम्थी र वडा नं. ६ खडियान मा सुधारिएको घट्ट चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गरि संचालनमा ल्याईएका छन्। सुधारिएको घट्टहरूबाट ५६ घरधुरीका ३३९ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्।



२.२ भौतिक प्रगति


यस अपिहिमाल पालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धि बुँदागत रुपमा तल उल्लेखित तालिकामा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका २ क्षेत्रगत समग्र भौतिक प्रगति

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	ईस्टिमेटेड संरचना											प्रतिवेदन सम्मको प्रगति विवरण											
			इन्टेक T 1	तारवार	मुख्य पाइप लाईन	शाखा लाइन	RVT	वास आउट	CC	DC/VC	केवल क्रसिङ	धारा	अन्य संरचना IWM	इन्टेक T 1	तारवार	मुख्य पाइप लाईन	शाखा लाइन	RVT	वास आउट	CC	DC/VC	केवल क्रसिङ	धारा	अन्य संरचना IWM	कैफियत
(क) सिचाइ तथा खानेपानी योजना तर्फको भौतिक प्रगति																									
१	खत्तौली नौपाटा पाइप सिचाइ योजना	अपिहिमाल ४	५	६	१२३०	४४८१	५	-	-	-	-	५७	-	२	६	१२३०	४४८१	५	-	-	-	५७	-	-	
२	चौविसन पाइप सिचाइ योजना	अपिहिमाल ४	१	४	३९५७	७५०	३	-	३	-	-	७२	१	२	३	३९५७	-	-	-	-	-	-	-	-	
३	चिल्डुङ्ग्रा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	अपिहिमाल ४	१	४	४५३४	४४५६	४	-	१	२	१	४९	१	-	-	२५००	४४४६	४	-	१	२	-	२५	-	
४	नौपाटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	अपिहिमाल ४	१	४	-	१२५०	२					१८	-	१	-	-	-	२	-		-	-	-	-	
५	लुम्थी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	अपिहिमाल ५	२	२	१३९०	४२७	१		१			६		२	१	१३९०	४२७	१					६	-	

(ख) सुधारिएको पानी घट्ट तथा चूलो योजना तर्फको भौतिक प्रगति			इन्टेक T1	पाइप लाइन	फोरबे टर्पकी	पेनस्टोक पाइप	साप्ट	घर	शौचालय घर						इन्टेक T1	पाइप लाइन	फोरबे टर्पकी	पेनस्टोक पाइप	साप्ट	घर	शौचालय घर					
१	घरघुरी स्तरमा सुधारीएको चुलो	अपिहिमाल २,३,४	-	११२	-	-	-	११२	-	-	-	-	-	-	-	११२	-	-	-	-	११२	-	-	-	-	-
२	छिपुलाकेदार मा वि मा सुधारिएको चुलो तथा भान्सा	अपिहिमाल ६	-	-	-	-	-	१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१	-	-	-	-	-
३	सुधारिएको पानी घट्ट योजना (खडियान)	अपिहिमाल ६	-	४००	१	५०	१	१	१	-	-	-	-	-	-	४००	१	५०	१	१	१	१	-	-	-	-
४	सुधारिएको पानी घट्ट योजना (थुम्ती)	अपिहिमाल ३	-	५०	१	३०	१	१	१	-	-	-	-	-	-	५०	१	३०	१	१	१	१	-	-	-	-
क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	ईस्टिमेटेड संरचना											प्रतिवेदन सम्मको प्रगति विवरण												
			कोठा संख्या	प्रयोग मैत्री शौचालय कोठा	सेप्टी टर्पकी									कोठा संख्या	प्रयोग मैत्री शौचालय कोठा	सेप्टी टर्पकी	सेप्टी टर्पकी									
(ग) जलवायु मैत्री विद्यालय खानेपानी तथा सरसफाइ योजना तर्फको भौतिक प्रगति																										
१	प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण भवानी मा.वि.सौगन्ना	अपिहिमाल ५	२	१	१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२	१	१	-	-	-	-	-	-	-	-	-
२	प्रयोजकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण डाडाबाग आ.वि. लुम्थी	अपिहिमाल ५	२	१	१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२	१	१	-	-	-	-	-	-	-	-	-

३	प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण भवानी मा.वि.घुसा	अपिहिमाल २	२	१	१	-	-	-	-	-	-	-	-	२	१	१	-	-	-	-	-	-	-	-
४	प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण सिद्धना आ.वि.घाजिर	अपिहिमाल ३	२	१	१	-	-	-	-	-	-	-	-	२	१	१	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) जलवायु उत्थानशील कृषि तथा कृषि वन तर्फका योजनाहरूको भौतिक प्रगति			घर	सुन्तला	कागती	मौसमी	चुक	तिमुर						घर	सुन्तला	कागती	मौसमी	चुक	तिमुर					
१	जलवायु मैत्री तरकारी खेती तथा ग्रीन हाउस निर्माण	अपिहिमाल ३,४	१३	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१३	-	-	-	-	-	-	-	-	-
२	श्री चौलानी कृषकनामक समूह	अपिहिमाल ५	१६९	९००	३६०	७२०	३६०	३६०	-	-	-	-	-	१६९	९००	३६०	७२०	३६०	३६०	-	-	-	-	-
(ङ) दिगो प्रकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा दिगो जल व्यवस्थापन तर्फको भौतिक प्रगति			इन्टेक	मुल संरक्षण	पाइप लाइन	तारवार	पोखरी	पिट्स	गेबिन झाली					इन्टेक	मुल संरक्षण	पाइपलाइन	तारवार	पोखरी	पिट्स	गेबिन झाली				
१	जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा पुर्भरण पोखरी योजना क्षेत्री	अपिहिमाल ३	१	१	२००	-	-	-	-	-	-	-	-	१	१	२००	-	-	-	-	-	-	-	-
२	जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा पुनर्भरण पोखरी कुर्मुल	अपिहिमाल ४	-	-	-	-	२	१५०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२	१५०	-	-	-	-	-
३	थुम्ती बाढी पहिरो नियन्त्रण (बायो इन्जिनियरिङ)	अपिहिमाल ३	-	-	-	-	-	-	४७	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	४७	-	-	-	-



तालिका ३ यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी:

क्र.सं.	आयोजनाको प्रकार	वार्षिक लक्ष्य		हासिल भएको उपलब्धि		प्रगति प्रतिशत (%)		कैफियत
		आयोजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	आयोजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	आयोजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	
१	खानेपानी आयोजनाहरू	३	८१३	१	२८९	३३%	३६%	२ योजना क्रमागत
२	बहुउपयोगी आयोजनाहरू	-	-	-	-	-	-	
३	सिचाइ आयोजनाहरू	२	६४२	१	४८०	५०%	७५%	१ योजना क्रमागत
४	पूर्ण सरसफाइका आयोजनाहरू	४	४४१	४	४३८	१००%	९९%	
५	जलवायु मैत्री कृषि हरित घर निर्माण आयोजना	१	५५	१	७१	१००%	१२९%	
६	सुधारिएको चुल्हो आयोजना (माटोको चुल्हो, फलामको चुल्हो)	२	२६१	२	२२३	१००%	८६%	
७	सुधारिएको पानी घट्ट आयोजना	१	१८८	२	३३९	२००%	१८०%	
८	कृषि वन आयोजनाहरू	१	३५०	१	८७४	१००%	२५०%	
९	जीविकोपार्जन आयोजनाहरू	-	-	-	-	-	-	
१०	बायोइन्जिनियरिड आयोजनाहरू	१	२००	१	२०५	१००%	१०२%	
११	पानीको स्रोत संरक्षण, ताल र पोखरीहरू संरक्षण, पानी भण्डारण/पुनर्भरण पोखरी, वर्षाको पानी संकलन आयोजनाहरू	१	८००	२	८७७	२००%	१०९%	
१२	प्रकृतिमा आधारित समाधान (NbS) का आयोजनाहरू (वातावरण संरक्षण गर्न, पहिरो/बाढी न्यूनीकरण कार्यहरू	-	-	-	-	-	-	-
१३	(तटबन्ध, पहिरो सुधार तथा स्थिरीकरण आदि) ।	-	-	-	-	-	-	

तालिका ४ यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरू

क्र.सं.	आयोजनाको प्रकार/क्षेत्र	आयोजनाको नाम	संक्षिप्त विवरण घरधुरी र जनसङ्ख्या	
			घरधुरी	जनसङ्ख्या
१	जलवायु उत्थानशील खानेपानी, बहुउपयोगी योजना, सरसफाइ तथा स्वच्छता	चिल्डुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	४९ ^१	२३७
		नौपाटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	४५ ^२	१९७
		लुम्थी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	६०	२८९
		प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण (भवानी मा.वि. सौगन्ना)	-	२०२
		प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण (महादेव मा.वि. घुसा)	-	१६२
		प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण (डाडाबाग आ.वि. लुम्थी)	-	४७
		प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण (सिद्धनाथ आ.वि. घाजिर)	-	२७
२	जलवायु उत्थानशील कृषि तथा कृषिवन	जलवायु मैत्री तरकारी खेती तथा ग्रीन हाउस सहयोग (डौलारी कृषि समूह)	१३	७१
		मलदेश सहकारी लाइ डाले चुक मुल्य श्रृंखला सहयोग	-	१३१८
३	जलवायु उत्थानशील सिचाइ	खतोली नौपाटा पाइप सिचाइ योजना	९४	४८०
		चौबिसन पाइप सिचाइ योजना	३०	१६२ ^३
४	सुधारिएको पानीघट्ट तथा सुधारिएको चुल्हो	छिपुलाकेदार मा वि मा सुधारिएको चुलो तथा भान्सा	-	१११
		खडियान सुधारिएको पानी घट्ट योजना	२१	१३४
		थुम्ती सुधारिएको पानी घट्ट योजना	३५	२०५
		घरधुरी स्तरमा सुधारीएको चुलो	११२	६४९
५	दिगो प्रकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा सामुदायिक वन	थुम्ती बाढी पहिरो नियन्त्रण (बायो इन्जिनियरिङ)	३५	२०५
		वन डढेलो व्यवस्थापन औजार सहयोग		११७८

^१ चालु आ.व. मा निर्माणाधिन रहेका^२ चालु आ.व. मा निर्माणाधिन रहेका^३ चालु आ.व. मा निर्माणाधिन रहेका

		वृक्षारोपण चौलानी कृषकनामक समुह	१६९	६४९
६	दिगो जल व्यवस्थापनका प्रयास तथा जल उपभोक्ता समिति	बिरे पन्यार जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा पुर्भरण पोखरी योजना	१९	९८
		जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा पुनर्भरण पोखरी कुर्मुल योजना क्षेत्र	१५७	७७९

तपसिल बमोजिमको कारणले लक्ष्य गरिए बमोजिम आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।
तालिका ५ लक्ष्य बमोजिम भौतिक उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष्य बमोजिम उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि अपिहिमाल गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति ।
१	पालिका र परियोजना बीच द्विपक्षीय सम्झौता ढिलो हुनु ।	समयमै योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्झौता गरी लागु गर्नु पर्ने ।
२	मन्त्रालयबाट रकम ढिला निकास हुनु ।	प्रतेक त्रैमासिक भित्र रकम निकाशाको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने
३	उपभोक्ता र पालिका बीच सम्झौता ढिला हुनु ।	वार्षिक कार्ययोजना बनाइ कार्य योजना अनुसार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
५	भौगोलिक बिकटताका कारण समयमा सामग्री ढुवानी हुन नसक्नु ।	वर्षात मौसम शुरू हुनु अघिनै खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरी सामग्री साइट नजिक भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
६	यार्चा गुम्बाको सिजन भएकोले उपभोक्ताहरू सबै यार्चा गुम्बा खोज्न लेक तीर गएकाले ।	पहिलो/दोस्रो त्रैमासिक भित्र कार्यान्वयन हुने सबै प्रकारका योजनाहरूको फाइनल डिजाइन स्टमेट तथा सम्झौता भइ समयमै योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने सो का लागि परियोजना कार्यान्वयन इकाइले मौसमी पात्रो बनाइ योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ने ।

२.२ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा यस अपिहिमाल गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धि हरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

तालिका ६ दिगो कृषि, भूमि र वन व्यवस्थापन अभ्यासहरू गर्न तालिम सहभागीको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	अपाङ्गता
घर बगैचा तालिम	१	-	-	-	७४	१०	७५	१०	
अगुवा कृषक तालिम	-	-	-	-	२	३	२	३	-
जम्मा	१	-	-	-	७६	१३	७७	१३	
प्रतिशत	१.११%				९८.८९%				

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.३ जलवायु उत्थानशील कृषि तथा कृषिवन क्रियाकलाप

यस आर्थिक वर्षमा कृषि तथा कृषिवन तर्फ यस अपिहिमाल गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धि हासिल भएको छ ।

तालिका ७ जलवायु उत्थानशील कृषि तथा कृषिवन प्रविधि सम्बन्धि क्रियाकलाप गर्ने घरधुरी विवरण

क्र.सं.	दिगो उत्पादन, आयआर्जन क्रियाकलापहरू	टोलको नाम, ठेगाना	व्यवसायिक कृषि गर्ने घरधुरी			
			दलित	जनजाती	अन्य(बाक्षेठस)	जम्मा
१	ग्रीन हाउस निर्माण	भट्टर, धामीगाउँ, छबिस, नौपाटा, खत्तोली, नौपाटा अपिहिमाल गाउँपालिका ३, ४	-	-	१३	१३
२	अगुवा कृषक तालिम	भट्टर, छबिस, नौपाटा, देउरुख खिर्सा	-	-	५	५
३	वन जन्य उत्पादनमा आधारित उद्यम विकासशिलता तालिम	खिर्सा थुम्ती	-	-	१६	१६

माथि उल्लेखित क्रियाकलापहरू मध्ये ग्रीन हाउस, अगुवा कृषक तालिम र वन जन्य उत्पादनमा आधारित उद्यम विकासशिलता तालिम क्रियाकलापहरू महिला लक्षित र अगुवा कृषक तालिम क्रियाकलापहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित र वन जन्य उत्पादनमा आधारित उद्यम विकासशिलता तालिम क्रियाकलापहरू महिला लक्षित हुन । यसबाट तपसिल बमोजिममा लक्षित बर्गले प्रत्यक्ष लाभ हासिल गरेका छन् ।

तालिका ८ दिगो उत्पादन, आयआर्जन र बजारमा पहुँच बढाएका घरधुरीहरू सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	दिगो उत्पादन, आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसायिक कृषि गर्ने व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	ग्रीन हाउस निर्माण गरी तरकारी उत्पादनबाट	-	-	१३	१३
जम्मा		-	-	१३	१३

माथि उल्लेखित क्रियाकलापहरू मध्ये ग्रीन हाउस निर्माण गरी तरकारी उत्पादनबाट क्रियाकलापहरू महिला लक्षित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित हुन । यसबाट तपसिल बमोजिममा लक्षित बर्गले प्रत्यक्ष लाभ हासिल गरेका छन् ।

तालिका ९ उपभोक्ता समिति सम्बन्धी विवरण


क्र.सं	समितिको नाम	मुख्य पदहरूमा प्रतिनिधित्व					समितिमा कुल सदस्यहरू	कैफियत
		बाक्षेठस	दलित	जनजाती	अन्य	अपाङ्गता		
नतिजा १: जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन तथा भू पारिस्थितिक प्रणालीको समावेशी व्यवस्थापन र संरक्षण								
१	खत्तोली नौपाटा पाइप सिंचाइ योजना	७	२	-	-	१	९	
२	थुम्ती बाढी पहिरो नियन्त्रण योजना	७	-	-	-	-	७	
३	थुम्ती सुधारिएको घट्ट निर्माण योजना	७	-	-	-	-	७	
४	खडियान सुधारिएको घट्ट निर्माण योजना	७	-	-	-	-	७	

५	घरायसी स्तरमा सुधारिएको चुलो निर्माण योजना	७	-	-	-	-	७	
६	चौविसन पाइप सिंचाइ योजना	७	-	-	-	-	७	
७	डोःलारी कृषि समूह	११	-	-	-	-	११	
८	चौलानी कृषकनामक समूह	७	-	-	-	-	७	
९	श्री मल्देश सहकारी संस्था	८	१	-	-	-	९	
१०	श्री छिपुलकेदार मावि धकं	७	-	-	-	-	७	


नतिजा २: समावेशी र दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन अभ्यासको सबलीकरण

१	प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण भवानी मा.वि. सौगन्ना	७	-	-	-	-	७	
२	प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण महादेव मा.वि. घुसा	७	-	-	-	-	७	
३	प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण डाडाबाग आ.वि. लुम्थी	६	१	-	-	-	७	
४	प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण सिद्धनाथ आ.वि. घाजिर	७	-	-	-	-	७	
५	बिरे पन्यार जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा पुर्भरण पोखरी योजना	७	-	-	-	-	७	
६	जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा पुनर्भरण पोखरी कुर्मुल योजना क्षेत्र	११	-	-	-	-	११	
७	नौपाटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	६	१	-	-	-	७	
८	लुम्थी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	८	१	-	-	-	९	
९	चिल्डुडग्रा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	८	१	-	-	-	९	

उ.स.को संरचना



उपभोक्ता समितिको लैङ्गिकताका आधारमा प्रतिनिधित्व विवरण



तालिका १० जलवायु उत्थानशील, दिगो जलस्रोत र समावेशी व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम सहभागी विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	बाक्षेठस महिला	बाक्षेठस पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	अपाङ्गता
ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम	-	-	-	-	-	३	-	३	-
भुक्षय नियन्त्रण न्युनिकरणका उपाय बारे उपभोक्ता समिति र समुदायहरूलाई तालिम	-	-	-	-	१४	१५	१४	१५	-
जम्मा					१४	१८	१४	१८	
प्रतिशत	०%		०%		१००%				

तालिका ११ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास सम्बन्धि विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	ब्रा.क्षे.ठ.स . महिला	ब्रा.क्षे.ठ.स . पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	अपाङ्गता
परियोजना कार्यान्वयन इकाइमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता विकास तालिम	-	-	-	२	१	३	१	५	-
लैङ्गीक तथा जलवायुमैत्री बजेट कोडिङ्ग कार्यशाला गोष्ठी	-	१	-	-	४	२२	४	२३	-
वास प्लान तथ्याङ्क प्रमाणीकरण तथा योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी	-	-	-	-	४	९	४	९	-
जम्मा		१		२	९	३३	९	३६	
प्रतिशत	२.२२%		४.४४%		९३.३३%		१००%		

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका १२ परियोजना अन्तर्गत सन्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिम गरिएको स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	अपिहिमाल गाउँपालिका कार्यपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागी संख्या
१	खडियान सुधारिएको घट्ट	१	१	४
२	लुम्थी खानेपानी योजना	३	२	४

३	प्रयोगकर्तामैत्री शौचालय निर्माण लुम्थी	१	१	४
४	प्रयोगकर्तामैत्री शौचालय निर्माण सौगन्ना	१	१	४
५	थुम्ती बाढी पहिरो नियन्त्रण योजना	१	१	२
६	थुम्ती सुधारिएको घट्ट निर्माण	१	१	२
७	प्रयोगकर्तामैत्री शौचालय निर्माण घुसा	१	१	१
८	प्रयोगकर्तामैत्री शौचालय निर्माण घाजिर	१	१	३
९	डौलारी कृषक समूह गर्न हाउस निर्माण अपिहिमाल ३.४	१	१	०
१०	चिल्डुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	२	३
११	चौबिसन पाइप सिंचाइ योजना	३	२	३
१२	कुर्मुल पुनर्भरण पोखरी निर्माण योजना	१	१	१
१३	नौपाटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	१	२
१४	क्षेती जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा पुनर्भरण पोखरी योजना	१	१	३
	जम्मा	२२	१७	३६

तालिका १३ अपिहिमाल गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश हुन नसकेको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटवारी)	१२	५	
२	त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन	४	२	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
४	NRDF अनुगमन प्रतिवेदन	१	१	
५	अन्य प्रतिवेदन	०	०	
	जम्मा	१८	११	

तालिका १४ अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन विवरण

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावहरू कार्यान्वयनको विवरण
१	२०८२।१०।११ देखी १४ गते सम्म	समिति र उपभोक्ताहरूलाई परियोजना बारे जानकारी गराउनु ।	पहिलो भेलामा समिति तथा उपभोक्ताहरूलाई परियोजनाबारे जानकारी गराएको ।
२	२०८२।०३।१२ देखी १९ गते सम्म	उपभोक्ताहरूलाई अनुदान श्रमदान बारे प्रस्ट गराउनु पर्ने । योजना स्थलमा नियमित प्राविधिकको उपस्थित हुनु पर्ने ।	पहिलो अनुगमन/सार्वजनिक सुनुवाइ/ सार्वजनिक परिक्षणबाट उपभोक्ताले पाउने अनुदान रकम, जनश्रमदान तथा सम्पूर्ण क्रियाकलाप बारे जानकारी गराएको । आवश्यकता अनुसार पालिका तथा वडाका प्राविधिकहरूसँग समन्वय सहकार्य गरी परिचालन गरेको ।

४. प्रगति समिक्षा तथा योजना तर्जुमा

तालिका १५ अपिहिमाल गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०८२।०७।३०	कार्य प्रगति समिक्षा सम्पन्न योजनाहरूको भुक्तानी गाउँपालिकाको N-WASH Plan सम्बन्धमा वार्षिक कार्ययोजना पारित सम्बन्धमा कर्मचारी पद पूर्ति तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा विविध सम्बन्धमा
२	२०८२।१२।०७	कार्य प्रगति समिक्षा अनुमानित लागत प्रतिवेदन स्वीकृत सम्बन्धमा Model Land scape क्याचमेन्ट क्षेत्र प्राथमिकरण सम्बन्धमा । आव २०८२।०८३ का लागि दररेट विश्लेषण स्वीकृत सम्बन्धमा । कर्मचारी व्यवस्थापन पदपूर्ति सम्बन्धमा । वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना तयारी तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धमा ।
अन्य साझेदारहरूले आयोजना गरेको बैठकहरूमा सहभागी र छलफलका प्रमुख विषयबस्तुहरू		
१	विश्व खाद्य सुरक्षा परियोजना (WFP)	स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइ रैथाने बालीहरूको संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गर्ने । तरकारी खेती व्यवसायमा सहयोग सम्बन्धी विद्यालय स्तरमा रहेको भान्सा घरको व्यवस्थापन सम्बन्धी

तालिका १६ : परियोजना कार्यान्वयन एकाइको द्वैमासिक/अर्धवार्षिक योजना तर्जुमा तथा प्रगति समीक्षा बैठक

क्र.सं.	मिति	प्रमुख विषयगत छलफल तथा अभिमुखिकरणको शिर्षक
१	२०८३।०१।१५	वार्षिक कार्य योजना (AWP) सम्बन्धि छलफल । योजनाहरूको सर्वे तथा डिजाइन स्टमेट सम्बन्धमा । मासिक कार्ययोजना सम्बन्धमा ।
२	२०८३।०३।२९	हाल सम्म भएका कार्य प्रगति समिक्षा । वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

५. परियोजना सँग सम्बन्धित स्थानीय तहका ऐन, नियम, नियमावली, रणनीति, तथा योजना सम्बन्धी क्रियाकलापहरू

परियोजना वार्षिक कार्यक्रम AWP भन्दा थप गतिविधिहरू/ अनुशरणीय, अनुकरणीय तथा उदाहरणीय क्रियाकलापहरू

- ✦ अपिहिमाल गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।

६. परियोजनाका अन्तरसम्बन्धित उद्देश्यसँग सम्बन्धित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू

६.१ लैङ्गिक समानता तथा भेदभाव रहित र अपाङ्गता समावेशीकरण

- ✦ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आत्म सम्मान पैरबी नेतृत्व विकास तालिम ।
- ✦ प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय तथा बालमैत्री संरचना निर्माण ।
- ✦ उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा ५० प्रतिशत महिला सहभागी सहित दलित जनजाती अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न समुदायको अर्थपूर्ण सहभागीता ।

६.२ जलवायु उत्थानशिलता मुलप्रवाहिकरण

- ✦ ग्रीन हाउस निर्माण गरी बेमौसमी तरकारी उत्पादन ।
- ✦ अपिहिमाल गाउँपालिकामा २ वटा पाइप सिचाइ योजना निर्माण ।

६.३ न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास प्रवर्द्धन

- ✦ घरायसी स्तरमा सुधारिएको चुलो सहयोग योजना ।
- ✦ सुधारिएको भान्सा घर निर्माण ।

६.४ जैविक विविधता र वातावरणको संरक्षण

- वृक्षारोपण कार्य गरेको ।
- भुक्षय नियन्त्रण न्युनिकरणका उपाय बारे उपभोक्ता समिति र समुदायहरूलाई तालिम ।
- बाढी पहिरो क्षेत्रहरूमा वृक्षारोपण तथा तटबन्ध निर्माण कार्य गरेको ।
- विपद पुर्व तयारीका लागि वन डढेलो नियन्त्रण समग्रीहरू खरिद ।
- रिचार्ज पोखरी निर्माण ।

७. सहकार्य

तालिका १७ परियोजनासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	Wine to Water	पानी शुद्धिकरण यन्त्र (Water Filter) विशेषता बारे जानकारी	अभिमुखिकरण	१,२५,०००।-
२	DMI	N-WASH Plan निर्माण	गोष्ठी	
३	WFP	रैथाने बाली तथा तरकारी खेती विस्तार बारे	समन्वय सहकार्य	

८. आगामी आर्थिक वर्षका लागि परियोजना तर्फका प्रमुख प्राथमिकताहरू र समपुरक बजेटको व्यवस्था

पालिकाको समपुरक बजेट सम्बन्धि कार्यपालिका वा गाउँ/नगरसभा बैठक निर्णय को प्रतिलिपि अनुसूची ०९ मा संलग्न छ ।


९. सिकाई, चुनौती तथा समस्याहरू

प्रतिवेदन अवधिका प्रमुख सिकाईहरू:

- ✦ योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्र कार्य योजना बनाइ परियोजनाको चरणबद्ध कार्य पद्धति बमोजिम सुरु गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
- ✦ विवादहरूलाई मध्यनजर गरी आम भेलामै निर्णय गर्ने र संरचना निर्माण हुने स्थानमा सम्बन्धित उपभोक्ताबाट कुनैपनि प्रकारको विवाद नगर्ने गरी सहमति लिने, दिने ।
- ✦ योजनाको डिजाइन लागत इष्टिमेट बमोजिम संरचना निर्माण, ढुवानी भाडा, स्टोर भाडा, दक्ष अदक्ष कामदार ज्याला लगायत अन्य कुराहरूमा उपभोक्ता समिति र उपभोक्ताहरू आम भेलामा प्रष्ट पार्नुपर्ने ।
- ✦ सप्लायर्सहरूले आपूर्ति गरेको बाह्य निर्माण सामग्री अर्डर लिष्ट र स्पेसिफिकेशन बमोजिम राम्रोसँग चेकजाँच गरेर मात्रै उपभोक्ता समितिलाइ बुझ्न आग्रह गर्ने गराउने ।
- ✦ स्थानीय उपभोक्ता समुदायको सक्रिय सहभागिताले परियोजनाको दिगोपना बढाउछ ।
- ✦ महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अति विपन्न समूहको सहभागिताले परियोजना थप सहमावेशी बन्छ ।
- ✦ नियमित अनुगमन, प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकास तालिमहरूले कार्यको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ ।
- ✦ वडा पालिका र सरोकारवालाबीचको समन्वय सहकार्यले कुनै पनि कार्य कार्यान्वयन गर्न सहजता हुने ।

प्रतिवेदन अवधिका प्रमुख चुनौती तथा समस्याहरू:

- ✦ जेन्जी आन्दोलन र प्रतिनिधी सभा चुनावका कारण योजनाहरूको कार्यान्वयन चरणको सम्झौता ढिला हुनु ।
- ✦ बाह्य निर्माण सामग्री लटिनाथ देखी मकरीगाड सम्म कच्ची रोड भएका कारण ढुवानीमा समस्या तथा असजिलो सामग्रीहरू खराब बाटोका कारण योजना स्थल सम्म ढुवानी गर्नमा समस्याका साथै जिल्ला दररेट भन्दा महोडगो रेट दिएर ढुवानी गर्नु पर्ने ।
- ✦ यार्चागुम्बा सिजनका कारण सबै उपभोक्ताहरू लेक जाने भएकोले कामको गतिमा ढिला हुदाँ लक्ष्य अनुसार सम्पन्न गर्नमा केही ढिला हुने गरेको ।
- ✦ जनश्रमदानको छुट्टै लेखा राख्नुपर्ने हुँदा परियोजनाको मापदण्ड बमोजिम योजना क्षेत्रका सबै घरधुरीबाट जनश्रमदान जुटाउन नसकिनु ।
- ✦ योजनामा काम गर्ने कामदारहरू (दक्ष, अदक्ष) तथा संरचना अनुसारको हाजिर अपडेट गर्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले नमान्नु । सम्बन्धित योजना क्षेत्रको जिम्मेवार प्राविधिकहरूले दिनहुँ हाजिरी अध्यावधिक गर्ने गरेको ।
- ✦ समुदायको सहभागीता सबै समूह वा व्यक्तिबाट समान रूपमा सुनिश्चित गर्न कठिनाई ।
- ✦ दुर्गम भौगोलिक विकटताका कारण अनुगमन तथा सामग्री ढुवानीमा कठिनाई ।
- ✦ सीमित बजेट र स्रोतसाधनले कुनै योजनाहरूमा समुदायको जनश्रमदान बढी गर्नु पर्ने ।



तालिका १८ समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयास तथा उपायहरू

क्र.सं.	चुनौती तथा समस्याहरू	समाधानका लागि गरिएका प्रयास तथा उपायहरू
१	भौगोलिक विकटताका कारण निर्माण सामग्रीहरू समयमा योजना स्थलमा पुर्‍याउन नसकिएको ।	रोड हेड सम्म पुगेका सामग्रीहरू स्थानीय दर रेट भन्दा बढी ज्यालादारी दिएर योजना स्थलहरूमा सामग्रीहरू समयमै पुर्‍याएको ।
२	उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू सामान्य लेखपढ मात्र गर्न सक्ने भएकोले आर्थिक हिसाब किताब, निर्णय लेख, बिल भरपाई, मिलाउन नसक्ने ।	योजना किताब (हिसाब किताब, बिल भरपाई) मिलाउनम सहजिकरण गरी उपभोक्तालाई भुक्तानी लिन सजिलो भएको ।
३	परियोजनाको उद्देश्य बारे प्रस्ट नहुनु ।	परियोजना/पालिकाका कर्मचारीहरू गएर प्रतेक योजनाहरूमा परियोजना बारे अभिमुखिकरण गरेको ।



अनुसूची ३: अपिहिमाल पालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू

युवाको कृषि सपना

पृष्ठभूमि: अपिहिमाल गाउँपालिका वडा नं. ०३, भट्टार निवासी २० वर्षीय युवा श्री प्रविन लोथ्यालले कृषि क्षेत्रमा आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सफल भएका छन्। सानैदेखि लगनशील, मेहनती र केही नयाँ गर्ने चाहना बोकेका प्रविनले १८ महिने कृषि प्राविधिक शिक्षा (JTA) श्री खण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयबाट पूरा गरे। अध्ययनपछि उनका केही साथी रोजगारीको खोजीमा शहरतिर लागे, केही उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं गए। तर प्रविनको मन भने आफ्नै गाउँको माटोसँग जोडिएको थियो। उनले सोचथे यहाँको माटो सुनभन्दा कम छैन; यदि आधुनिक तरिकाले खेती गर्न सकियो भने रोजगारी खोज्दै बाहिर जानु पर्दैन। यही सोचले उनले आफ्नै गाउँको माटोलाई उत्पादन र आत्मनिर्भरताको आधार बनाउने संकल्प गरे। गाउँमा रहेका युवा साथीहरूलाई पनि आधुनिक कृषि अपनाउन प्रेरित गर्दै उनी दिनहुँ सरसल्लाह र छलफल गर्थे। सुरुवाती दिनमा धेरैले उनको मजाक गरे र डोलारी भनेर उपनामसमेत दिए, तर ती टिप्पणीले उनको संकल्प अझ बलियो बनायो। एक साँझ परिवारसँग खाना खाँदै उनले बा आमासँग प्लाष्टिक घर (ग्रीन हाउस) निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग मागे। सुरुमा परिवार सहमत नभए पनि उनको अठोट र निरन्तर आग्रहपछि एउटा ग्रीन हाउसका लागि सहयोग गर्ने सहमति भयो। त्यो रात प्रविनका लागि अविस्मरणीय बन्यो खुशी, उत्साह र चुनौतीका अनेक कल्पनाले उनलाई निदाउनै दिएन।



सुरुवातमा प्रविनले एउटा ग्रीन हाउस र घर नजिकको सानो जमिनबाट तरकारी खेती थाले। सानो क्षेत्रबाट व्यवसाय सुरु गरेको देखेर धेरैले हाँसो र शंका व्यक्त गरे। कसैले खेतीबाट कमाइ नहुने भन्दै विदेश जान सुझाव दिए, तर प्रविनले हार मानेनन्। पहिलो वर्षमै उत्पादन राम्रो भयो र मकरीगाड तथा खण्डेश्वरीका स्थानीय बजारमा तरकारी बिक्री गरेर अपेक्षाभन्दा राम्रो आमदानी गर्न सफल भए। यसले उनलाई थप आत्मविश्वास दियो। अर्को वर्ष उनले थप एउटा ग्रीन हाउस निर्माण गरी खेतीको क्षेत्र विस्तार गरे। एक दिन स्थानीय बजारमा तरकारी बेच्दै गर्दा लक परियोजनाका एक जना कर्मचारीको नजर उनीमाथि पन्यो। उहाँले प्रविनलाई बोलाएर यति सानै उमेरमा तरकारी व्यवसाय गरिरहेको कारण सोध्नुभयो। प्रविनले आफूले आफ्नै व्यवसायका रूपमा तरकारी

खेती गरिरहेको बताएपछि उहाँले व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेको अवस्थामा परियोजनाबाट सहयोग हुन सक्ने कुरा बताउनुभयो। यो कुरा सुन्दा प्रविनलाई ढुङ्गा खोज्दा देवता भेटिएको जस्तो अनुभूति भयो। केही दिनपछि उनी लक परियोजनाले आयोजना गरेको नौगाड गाउँपालिकाको दल्लेखमा आयोजित पाँच दिने अगुवा कृषक तालिममा सहभागी भए। तालिमबाट उनले आधुनिक तरकारी खेती, व्यवसाय व्यवस्थापन र बजारसँग जोडिने विषयमा धेरै महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल गरे। तालिमपश्चात जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना (LACC Project)को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा १० जना किसानले ग्रीन हाउस निर्माणका लागि सहयोग प्राप्त गरे। तालिममा सिकेका कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्ने उद्देश्यले मिति २०८२।०२।२० गते गाउँका केही युवा किसानसँग मिलेर प्रविनले आफ्नै उपनामबाट परिचित डोलारी कृषि समूह गठन गरी पालिकामा दर्ता गरे। हाल उनी सो समूहको अध्यक्षका रूपमा सक्रिय छन्।

व्यवसाय सुरु गरिसकेपछिको अनुभव: पहिलो पटक आफ्नो बारीमा उत्पादन गरेको तरकारी बेचेर प्राप्त रकम आमाको हातमा राखेको दिन म कहिल्यै बिर्सिन सकिदैन। त्यो क्षण मेरो मेहनत, आशा र सपनाको पहिलो प्रतिफलजस्तै थियो। व्यवसाय सुरु गर्दा पुँजी व्यवस्थापन, बजार खोजी, अर्गानिक उत्पादनलाई निरन्तरता दिने र ग्राहकको विश्वास जित्ने जस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्थ्यो। तर मेरो लगनशीलता र मेहनत देखेर जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना (LACCP) अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा थप १० दिने पुनः अगुवा कृषक तालिममा सहभागी हुने अवसर पाएँ। उक्त तालिमले मलाई व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित, व्यावसायिक र दिगो बनाउने नयाँ ऊर्जा र आत्मविश्वास प्रदान गरेको छ।



व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा समय व्यवस्थापन, ग्राहकसँग विश्वासिलो सम्बन्ध कायम गर्ने, बजारको मागअनुसार उत्पादन गर्ने र कृषि व्यवसायमा आधुनिक प्रविधि अपनाउने विषयमा धेरै व्यावहारिक सिकाइ भयो। विशेषगरी तालिमबाट आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन र आमदानी दुवै वृद्धि गर्न सकिने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न पाएँ।

ताजा र गुणस्तरीय तरकारी उत्पादन हुन थालेपछि ग्राहकहरूको विश्वास क्रमशः बढ्दै गयो। फलस्वरूप डोःलारी कृषि समूहबाट उत्पादित ताजा तरकारी स्थानीय बजार, विद्यालय, होटल हुँदै मार्माको लटिनाथ र गोकुलेश्वर बजारसम्म पुग्न थालेको छ। दुई वर्षको अवधिमा व्यवसाय विस्तार गर्दै डल्ले खुर्सानी, लसुन र मुलाको अचार उत्पादन गरी बजारमा बिक्री गर्न थालेको छु। मेरो सफलताबाट प्रेरित भएर गाउँका अन्य युवाहरू पनि कृषि व्यवसायतर्फ आकर्षित भएका छन् र डोःलारी कृषि समूहमा आबद्ध हुन थालेका छन्। आजभोलि गाउँघरमा मलाई देखेबित्तिकै धेरैले 'डोःलारी आउनुभयो' भनेर बोलाउँछन्। आफ्नै नामभन्दा डोलारी भनेर चिनिँदा मलाई गर्व र खुशी दुवै महसुस हुन्छ। यस यात्राले धैर्यता, निरन्तर सिकाइ र मेहनत नै सफल व्यवसायको मुख्य आधार हुनु भन्ने महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। आगामी दिनमा व्यवसायलाई अझ विस्तार गर्दै बेरोजगार युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छु।

कृषकहरूको चुनौती: म लगायत यस क्षेत्रमा कृषि व्यवसायमा लागेका सम्पूर्ण कृषकहरूका लागि व्यवसायलाई दिगो रूपमा टिकाइराख्नु अहिले पनि ठूलो चुनौती बनेको छ। यातायातको सहज पहुँच नहुँदा उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूल समयमै बजारसम्म पुऱ्याउन कठिनाई हुने गरेको छ। साथै जलवायु परिवर्तनका कारण हुने अनियमित वर्षा, खडेरी, कृषि रोग तथा कीराको प्रकोप, गुणस्तरीय बीउ र कृषि सामग्री समयमै नपाउनु तथा उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु कृषकहरूले भोगिरहेका प्रमुख



समस्याहरू हुन्। यस कारण म लगायत सयौं कृषकहरूलाई बजारसम्म सहज पहुँच पुऱ्याउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाले कृषकहरूको वास्तविक आवश्यकता बुझेर नयाँ प्रविधि, भण्डारण तथा प्रशोधन पूर्वाधार निर्माण र बजारीकरणमा विशेष सहयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ। यहाँका अर्गानिक उत्पादनलाई गोकुलेश्वर, खलंगा बजार हुँदै सीमावर्ती भारतको धारचुला बजारसम्म पुऱ्याउन सकिएमा कृषकहरूको व्यवसाय दिगो रूपमा सञ्चालन हुने ठूलो सम्भावना छ। अन्त्यमा, मलाई यहाँसम्म चिनाउन र कृषि व्यवसायमा अघि

बढ्न सहयोग गर्नुहुने अपिहिमाल गाउँपालिका र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।



अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित आयोजनाहरूको विवरण

आयोजनाको नाम	वडा नं.	आयोजनाको अनुमानित लागत (रु.) (GoN+GoF+EU+LG)	यस आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु.) (GoN+GoF+EU+LG)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु.) (GoN+GoF+EU+LG)	यस आयोजनामा पालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष्य (GoN+GoF+EU+LG)	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वित जनसंख्या	
								घरधुरी	जनसंख्या
१. जलवायु उत्थानशील कृषि तथा कृषिवन सम्बन्धि क्रियाकलापहरू		४,१३७,४७९	९८१,४६२	९८१,४६२	२९६,६९६	-	-	१,३३१	१,३८९
जलवायु मैत्री कृषि पुँजिगत सहयोग		२२५,०००	-	-	-	-	-	-	-
जलवायु मैत्री तरकारी खेती तथा ग्रीन हाउस सहयोग	३ र ४	५६७,४७९	५६७,४७९	५६७,४७९	२८२,७१३	नजाने	-	१३	७१
तरकारी मुल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम तथा संकलन केन्द्र, हाटबजार सहयोग		५९५,०००	-	-	-	-	-	-	-
बहुउद्देशिय नर्सरी स्थापना तथा सबलिकरण		७८०,०००	-	-	-	-	-	-	-
बाढी पहिरो क्षेत्रमा बृक्षारोपण (काष्ठजन्य, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा जडिबुटी सुगन्धित विरूवा, घास, फलफुल)		८४०,०००	-	-	-	-	-	-	-
भर्मी कम्पोष्ट स्थापना सहयोग		७५,०००	-	-	-	-	-	-	-
मलदेश सहकारी लाइ डाले चुक मुल्य श्रृंखला सहयोग	१ देखि ६	४६०,०००	४१३,९८३	४१३,९८३	१३,९८३	नजाने	-	१,३१८	१,३१८
स्थानीय उत्पादन मुल्य श्रृंखला सहयोग तथा कोसेली घर, विउ बैक स्थापना		५९५,०००	-	-	-	-	-	-	-
२. जलवायु उत्थानशिल सिचाइ		९,०८५,०७५	६,८७८,२७५	३,१०६,६८८	१६९,०००	-	१,४५९,५२७	१२४	६४२
चौबिसन सिचाइ योजना	४	४,३४३,७५४	२,८८४,२२७	२,८८४,२२७	-	जाने	१,४५९,५२७	३०	१६२
खतोली नौपाटा पाइप सिचाइ योजना	४	४,७४१,३२१	३,९९४,०४८	२२२,४६१	१६९,०००	नजाने	-	९४	४८०
३. सुधारिएको पानीघट्ट तथा सुधारिएको चुल्हो		३,०३७,७८४	२,७८२,३१०	१,८५७,५६९	५४५,५२०	-	-	१६८	१,०९९
घरधुरी स्तरमा सुधारीएको चुलो	२, ३ र ४	९०७,९५३	८९५,५२०	८९५,५२०	३४५,५२०	नजाने	-	११२	६४९
छिपुलाकेदार मा वि मा सुधारिएको चुलो तथा भान्सा	६	१,१६८,४६६	९८३,०७६	५८,३३५	२००,०००	नजाने	-	-	१११
सुधारिएको पानी घट्ट योजना (खडियान)	६	५०२,१८३	४७०,९६५	४७०,९६५	-	नजाने	-	२१	१३४
सुधारिएको पानी घट्ट योजना (थुम्ती)	३	४५९,१८२	४३२,७४९	४३२,७४९	-	नजाने	-	३५	२०५
४. दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा सामुदायिक बन उपभोक्ता समिति		१,५११,५६०	१,३६५,६९९	१,३६५,६९९	२६६,३१५	-	-	३२९	२,२५७
थुम्ती बाढी पहिरो नियन्त्रण (बायो इन्जिनियरिङ)	३	७४८,२८५	७००,३१५	७००,३१५	१८६,३१५	नजाने	-	३५	२०५
बन उढोलो व्यवस्थापन औजार सहयोग	३ र ४	५६३,८६८	४६८,३१७	४६८,३१७	८०,०००	नजाने	-	१२५	१,१७८

आयोजनाको नाम	वडा नं.	आयोजनाको अनुमानित लागत (रु.) (GoN+GoF+EU+LG)	यस आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु.) (GoN+GoF+EU+LG)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु.) (GoN+GoF+EU+LG)	यस आयोजनामा पालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष्य (GoN+GoF+EU+LG)	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वित जनसंख्या	
								घरधुरी	जनसंख्या
बृक्षारोपण (काष्ठजन्य, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा जडिबुटी सुगन्धित विरूवा, घाँस, फलफुल)	५	१९९,४०७	१९७,०६७	१९७,०६७	-	नजाने	-	१६९	८७४
५. दिगो जल व्यवस्थापनका प्रयास तथा जल उपभोक्ता समिति		१,९५४,९७०	१,५१३,८६४	१,५१३,८६४	३५२,०६०	-	-	१७८	८७७
जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा पुनर्भरण पोखरी कुर्मुल योजना क्षेत्र	४	५५२,७३५	५३५,५४०	५३५,५४०	-	नजाने	-	१५७	७७९
पानीको मुहान संरक्षण योजना	३	१,४०२,२३५	९७८,३२४	९७८,३२४	३५२,०६०	नजाने	-	२९	९८
६. जलवायु उत्थानशिल खानेपानी, बहुउपयोगी योजना, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धि योजना		१३,३६५,६१२	८,७७९,४४४	८,७७९,४४४	१,३०२,२८८	-	३,१५४,३९०	१५४	१,१६१
चिलढुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	४	५,८७१,४९६	३,६२७,२८६	३,६२७,२८६	६९२,२८६	जाने	२,२४४,२१०	४९	२३७
नौपाटा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	४	१,८१९,८११	९०९,६३१	९०९,६३१	८५,०००	जाने	९१०,१८०	४५	१९७
प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण (डाडाबाग आ वि लुम्थी)	५	७८०,९३९	७६२,३३९	७६२,३३९	-	नजाने	-	-	४७
प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण (भवानी मा. वि. सौगत्रा)	५	७८१,६१७	७५७,३४४	७५७,३४४	१५०,०००	नजाने	-	-	२०२
प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण (महादेब मा. वि. घुसा)	२	८४०,८८७	८१५,७४३	८१५,७४३	१७०,७४३	नजाने	-	-	१६२
प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण (शिद्धार्थ आ. वि. घाजिर)	३	९२७,४८९	९१५,२५९	९१५,२५९	२०४,२५९	नजाने	-	-	२७
लुम्थी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	५	१,२६३,३७३	९९१,८४२	९९१,८४२	-	नजाने	-	६०	२८९
होमस्टे तथा आमा समुहमा इन्सीनिटर तथा फोहर संकलन तथा व्यवस्थापन निर्माण	१,२	१,०८०,०००	-	-	-	-	-	-	-
जम्मा		३३,०९२,४८१	२२,३०१,०५४	१७,६०४,७२६	२,९३१,८७९	-	४,६१३,९१७	२,२८४	७,४२५


 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 काठमाडौं


 लोकेश्वर वहादुर विष्ट
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिम अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	ब्रा.क्षे.ठ.स. महिला	ब्रा.क्षे.ठ.स. पुरुष	अपाङ्गता भएका महिला	अपाङ्गता भएका पुरुष
सिंचाइ आयोजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम			५	५	-	-	-	-	२३	१८	-	-
१	चौबिसन सिंचाइ योजनामा परियोजना अभिमुखिकरण, लैससास तथा पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धि अभिमुखिकरण	४	१	१	-	-	-	-	४	३	-	-
२	चौबिसन सिंचाइ योजनामा आर्थिक ब्यवस्थापन तालिम	४	१	१	-	-	-	-	५	३	-	-
३	चौबिसन सिंचाइ योजनामा कृषि वन तथा जैविक विविधता सम्बन्धि अभिमुखिकरण	४	१	१	-	-	-	-	४	३	-	-
४	चौबिसन सिंचाइ योजनामा जलवायु उत्थानसिल पानी सुरक्षा योजना योजना, संचालन र दिगोपना तथा पानीको गुणस्तर सम्बन्धि अभिमुखिकरण	४	१	१	-	-	-	-	४	४	-	-
५	चौबिसन सिंचाइ योजना निर्माण पूर्ब गोष्ठी	४	१	१					६	५	-	-
जलवायु उत्थानशील कृषि तथा सहकारी मूल्य-श्रृङ्खला विकास आयोजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम			२१	६	१	-	-	-	९३	१९	-	-
१	चिल्डुङग्रा खा पा स, चौबिसन सिंचाइ तथा नौपाटा सिंचाइ योजना क्षेत्रमा घरबगैचा तालिम (३ वटा ईभेन्ट)	४	९	३	१	-	-	-	७४	१०	-	-
२	क्लस्टर स्तरिय कृषक पाठशाला तालिम (Farmers Field School) नौगाड दल्लेख	२	१०	१	-	-	-	-	२	३	-	-
३	ग्रीन हाउस योजना कृषी समुहलाई परियोजना,आर्थिक व्यवस्थापन तथा लेखापालन तथा सामग्री स्पेफिकेशन सम्बन्धी तालिम ।	३	१	१	-	-	-	-	७	३	-	-
४	मल्देस सहकारी_परियोजना अभिमुखिकरण तथा मूल्य श्रखला अभिमुखिकरण	४	१	१	-	-	-	-	१०	३	-	-
जलवायु उत्थानशील कृषि वन आयोजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम			३	१	-	-	-	-	१६	-	-	-
१	उधमशिला तालिम	३	३	१	-	-	-	-	१६	-	-	-
सुधारिएको घट्ट/चुलो निर्माण योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम			३	३	-	-	-	-	१७	५	-	-
१	धुम्लि सुधारिएको घट्ट योजनामा परियोजना लैससास अभिमुखिकरण	३	१	१	-	-	-	-	७	१	-	-
२	खडियान सुधारिएको घट्ट योजनामा परियोजना लैससास अभिमुखिकरण	६	१	१	-	-	-	-	४	३	-	-
३	सुधारिएको चुलो खरिद,भण्डारण तथा लेखाजोखा/खातापाता व्यवस्थापन सम्बन्धि अभिमुखिकरण	२,३,४	१	१	-	-	-	-	६	१	-	-
खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम			२०	२०	१०	५	-	-	७९	७०	-	-
१	चिलढुग्रा खा पा स मा जलवायु उत्थानसिल पानी सुरक्षा योजना, दिगोपना तथा पानीको गुणस्तर सम्बन्धि अभिमुखिकरण	४	१	१	१	-	-	-	३	४	-	-
२	चिलढुग्रा खा पा स मा निर्माण पूर्ब गोष्ठी	४	१	१	१	-	-	-	८	२	-	-
३	चिलढुग्रा खा पा स मा लेखा व्यवस्थापन तालिम	४	१	१	१	-	-	-	४	४	-	-
४	चिलढुग्रा खा पा स मा परियोजना अभिमुखिकरण, लैससास तथा पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धि अभिमुखिकरण	४	१	१	१	-	-	-	४	४	-	-
५	चिल्डुङग्रा कृषि वन तथा जैविक विविधता सम्बन्धि अभिमुखिकरण	४	१	१	१	-	-	-	४	४	-	-
७	नौपाटा खा पा स मा कृषि वन तथा जैविक विविधता सम्बन्धि अभिमुखिकरण	४	१	१	-	१	-	-	४	२	-	-
९	नौपाटा खा पा स मा जलवायु उत्थानसिल पानी सुरक्षा योजना, दिगोपना तथा पानीको गुणस्तर सम्बन्धि अभिमुखिकरण	४	१	१	-	१	-	-	४	२	-	-
१०	नौपाटा खा पा स मा लेखा व्यवस्थापन तालिम	४	१	१	-	१	-	-	४	२	-	-
११	नौपाटा खा पा स मा परियोजना अभिमुखिकरण, लैससास तथा पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धि अभिमुखिकरण	४	१	१	-	१	-	-	४	२	-	-
१२	नौपाटा खा पा स मा निर्माण पूर्वको गोष्ठी	४	१	१	-	१	-	-	४	२	-	-
१३	लुम्थी खा पा स मा कृषि वन तथा जैविक विविधता सम्बन्धि अभिमुखिकरण	५	१	१	-	-	-	-	५	४	-	-
१४	लुम्थी खा पा स मा जलवायु उत्थानसिल पानी सुरक्षा योजना, दिगोपना तथा पानीको गुणस्तर सम्बन्धि अभिमुखिकरण	५	१	१	१	-	-	-	४	४	-	-

अतिरिक्त गाउँ पालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
काभ्रेपञ्चनरी, सार्थुङ्ग
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

लोकन्द्र बहादुर विष्ट
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिम अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	ब्रा.क्षे.ठ.स. महिला	ब्रा.क्षे.ठ.स. पुरुष	अपाङ्गता भएका महिला	अपाङ्गता भएका पुरुष
१५	लुम्बी खा पा स मा लेखा व्यवस्थापन तालिम	५	१	१	१	-	-	-	४	४	-	-
१६	लुम्बी खा पा स मा परियोजना अभिमुखिकरण, लैससास तथा पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धि अभिमुखिकरण	५	१	१	१	-	-	-	४	४	-	-
१७	लुम्बी खा पा स योजनामा निर्माण पुर्व गोष्ठी	५	१	१	१	-	-	-	३	२	-	-
१८	उ स व्यवस्थापन तालिम खलंगा पहिलो चरण	५	१	१	-	-	-	-	५	३	-	-
१९	डाडाबाग आ.वि. प्रयोक्तमैत्री शौचालय योजनामा परियोजना अभिमुखिकरण, लैससास तथा पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धि अभिमुखिकरण	५	१	१	१	-	-	-	२	४	-	-
२०	महादेव मा.वि. प्रयोक्तमैत्री शौचालय योजनामा परियोजना अभिमुखिकरण, लैससास तथा पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धि अभिमुखिकरण	२	१	१	-	-	-	-	४	६	-	-
२१	शिद्वनाथ आ.वि. प्रयोक्तमैत्री शौचालय योजनामा परियोजना अभिमुखिकरण, लैससास तथा पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धि अभिमुखिकरण	३	१	१	-	-	-	-	२	६	-	-
२२	भवानी मा.वि. सौगन्ना प्रयोक्तमैत्री शौचालय योजनामा परियोजना अभिमुखिकरण, लैससास तथा पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धि अभिमुखिकरण	५	१	१					३	५	-	-
प्रकृतीमा आधारित समाधान, जोखिम न्युनिकरण/व्यवस्थापन तथा बायोइन्जिनियरिङ्ग सम्बन्धित क्षमता विकास तालिम/गोष्ठी/ अनुशिक्षणहरु			२	२	-	-	-	-	१८	२०	-	-
१	भुक्षयी नियन्त्रण न्युनिकरणका उपाय बारे उपभोक्ता समिति र समुदायहरुलाई तालिम	३	१	१	-	-	-	-	१४	१५	-	-
२	धुम्ती तटबन्धन योजनामा परियोजना अभिमुखिकरण	३	१	१					४	५	-	-
बहुउपयोगी आयोजना चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सरसफाइ, स्वच्छता, महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन तथा अभियानहरु			२	१	१	-	-	-	७२	-	-	-
१	जलवायुमैत्री विद्यालय वास तालिम (खण्डेश्वरी मा वि मा)	४	२	१	१	-	-	-	७२	-	-	-
२	राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह	४	३		जम्मा महिला		जम्मा पुरुष		कूल जम्मा			
					१०८		३६		१४४			
३	बिश्व पानी दिवश	४	१		३९		१७		५६			
४	बिश्व महिला दिवश	४	१		४६		१८		६४			
५	बिश्व वातावरण दिवश	४	१		३१		५१		८२			
प्राविधिक तालिमहरु (जलस्रोत प्राविधिक, पम्प अपरेटर, ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता, स्थानीय स्रोत व्यक्ति, सुधारिएको चुल्हो प्रदर्शक)			१४	१	-	-	-	-	-	३	-	-
१	ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम	४	१४	१						३	-	-
गाउँपालिका स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु (जस्तै पुन प्रयोग स्थानीय टरी प्याड बनाउने, अचार, दुना, टपरी बनाउने, सावुन, हाते कपडा बनाउने अल्लो प्रशोधन गर्ने ...)			१६	१	-	-	-	-	१६	-	-	-
१	वन जयमा उत्पादित सीप विकास तालिम	३	१६	१	-	-	-	-	१६	-	-	-
कलस्टर/गाउँपालिका स्तरीय अन्य क्षमता विकास तालिम/गोष्ठी/ अनुशिक्षणहरु			७	३	-	१	-	२	९	३४	-	-
१	परियोजना कार्यान्वयन इकाइमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता विकास तालिम	-	३	१	-	-	-	२	१	३	-	-
२	लैङ्गीक तथा जलवायुमैत्री बजेट कोडिङ्ग कार्यशाला गोष्ठी	४	२	१	-	१	-	-	४	२२	-	-
३	वास प्लान तथ्याङ्क प्रमाणीकरण तथा योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी	४	२	१	-	-	-	-	४	९	-	-
कूल जम्मा			९३	४३	१२	६	-	२	३४३	१६९	-	-


 अतिरिक्त गाउँपालिका
 गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
 खण्डेश्वरी, ताप्लेजुङ
 सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल


 लोकेश्वर वहादुर विष्ट
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची २.२: आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को पेशकी बाँकीको अवस्था

कुल पेशकी रकम रु	कुल फर्छ्यौट गर्न बाँकी पेशकी रकम रु
-	-

अनुसूची ४: दृश्यता तथा प्रचारप्रसार (सूचना, शिक्षा र संचार)

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	टोपी र टि-शर्ट खरिद	२०८३।०३।३०	परियोजनाको लोगो सहितको प्रचारप्रसार
२	प्लेक्स प्रिन्ट	विभिन्न मितिहरूमा	परियोजनाको चरणबद्ध पद्धति बारे फ्याक्समा उल्लेख भएका सूचकहरू उपभोक्ता समितिहरूको भेला, तालिम, गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरूमा टाँस गरि सहजिकरण गर्ने गरेको ।

अनुसूची ५: परियोजना कार्यान्वयन एकाइ जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद	कार्यस्थल (डिउटी स्टेशन)	जम्मा कार्य गरेको अवधि (महिनामा)
क.	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ अन्तर्गत (हाल भएका) तथा परिचालित जनशक्ति			
१	श्री बिसन सिंह बुढाथोकी	लक परियोजना अधिकृत	अपिहिमाल गाउँपालिका	३ महिना
२	श्री समुन्द्र सिंह धामी	सब-इन्जिनियर	अपिहिमाल गाउँपालिका	३ महिना
३	श्री धन सिंह कुँवर	प्राविधिक	अपिहिमाल गाउँपालिका	३ महिना

अनुसूची ६: प्राविधिक तालिम प्राप्त जनशक्तिको विवरण

क्र.सं.	नाम	म/पु/अ	आयोजना/समुह/समुदायको नाम	ठेगाना र सम्पर्क नम्बर	कैफियत
क.	ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता				
१	श्री प्रताप सिंह ठेकरे	पु.	नौपाटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	९७६११११८७५	
२	श्री जय प्रकाश ठेकरे	पु.	चौबिसन पाइप सिंचाइ योजना	९८६९५२१३९९	
३	श्री रामलाल सिंह धामी	पु.	चिल्डुडग्रा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	९८६५८७२५२०	
ख.	जलस्रोत प्राविधिक				
-	-	-	-	-	-
ग.	अगुवा कृषक				
१	परविन लोथ्याल		डौलारी कृषि समूह	९८६५५७९७४४	
२	नवराज रोकाया		डौलारी कृषि समूह	९८४६३३४४५९	
३	नरजित सिंह ठेकरे		नौपाटा	९७६९३९७०५३	
४	दुरपति धामी		लम्थाङ	९८४८४३४३९७	
५	कमला बोहरा		देउरुख	९८६०६३६१९८	
घ.	वन हेरालु				
-	-	-	-	-	-
ङ.	पम्प अपरेटर				
-	-	-	-	-	-

च.	स्थानीय स्रोत व्यक्ति				
-	-	-	-	-	-
छ	सुधारिएको चुल्हो प्रवर्द्धक				
-	-	-	-	-	-
च	अन्य प्राविधिक तालिम प्राप्त जनशक्ति				
-	-	-	-	-	-

अनुसूची ७: निर्माण आयोजनाबाट प्रत्यक्ष स्थानीय रोजगारीको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	दक्ष कामदार रोजगारी दिन	अदक्ष कामदार रोजगारी दिन	जम्मा दिन
१	खतोली नौपाटा पाइप सिंचाइ योजना	१०	९६	१०६
२	थुम्ती बाढी पहिरो नियन्त्रण योजना	१२	४५	५७
३	थुम्ती सुधारिएको घट्ट निर्माण योजना	४	२५	२९
४	खडियान सुधारिएको घट्ट निर्माण योजना	४	२५	२९
५	घरायसी स्तरमा सुधारिएको चुलो निर्माण योजना	११२		११२
६	डोःलारी कृषि समूह	१३	३९	५२
७	चौलानी कृषकनामक समूह	१	-	१
८	श्री मल्देश सहकारी संस्था	१		१
९	श्री छिपुलकेदार मावि धकं सुधारिएको भान्सा घर निर्माण	२४	६८	९२
१०	प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण भवानी मा.वि. सौगन्ना	४	४५	४९
११	प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण महादेव मा.वि. घुसा	१०	४७	५७
१२	प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण डाडाबाग आ.वि. लुम्थी	४	४५	४९
१३	प्रयोगकर्ता मैत्री शौचालय निर्माण सिद्धनाथ आ.वि. घाजिर	१२	४७	५९
१४	बिरे पन्यार जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा पुर्भरण पोखरी योजना	७	३५	४२
१५	जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा पुनर्भरण पोखरी कुर्मुल योजना क्षेत्र	०	८९	८९
१६	लुम्थी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	४	४२	४६
कुल जम्मा		२४७	६९८	९४५

अनुसूची ८: परियोजनाका अन्य गतिविधिबाट श्रुजित प्रत्यक्ष स्थानीय रोजगारीको विवरण

क्र.सं.	परिचालीत समुदायको नाम	रोजगारीको प्रकार	संख्या (जना)	प्रतिवेदन अवधि सम्म सिर्जित रोजगारीको कार्यदिन
१	नौपाटा,सल्ली,माझगाउँ,चिल्डुङगा र चौबिसन	मर्मतसम्भार कार्यकर्ता	४ जना	१०५
२	छबिस भट्टार	अगुवा कृषक	३ जना	३०
३	खत्तोली,चिल्डुङगा, खण्डेशवरी, सम्भार भट्टार	व्यवसाय प्रवर्द्धक	४० जना	७०
४	लुम्थी,सोगन्ना, खडियन, थुम्ती, क्षेत्री, घुसा, खण्डेश्वरी	दक्ष मिस्री	३५ जना	३७५
कुल जम्मा			८२	५८०



अनुसूची ९: पालिकाको सम्पुरक बजेट सम्बन्धि कार्यपालिका वा गाउँ/नगरसभा बैठक निर्णयको प्रतिलिपि





तस्वीरमा पालिकामा संचालित विभिन्न योजनामा संचालित चरणबद्ध पद्धती तालिमा






तस्वीरमा पालिकाको कुर्मल योजना मुहान क्षेत्रमा निर्माण गरिएका रिचार्ज पोखरी र पिटहरू





तस्वीरमा पालिकामा संचालित विभिन्न योजनामा संचालित चरणबद्ध पद्धती तालिमा



अपिहिमाल गाउँपालिका

जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना
सुदूरपश्चिम प्रदेश दाचुला

सुधारिएको घट्ट निर्माण खडियान

सामाजिक तथा प्राविधिक विवरण

उपभोक्ता समितिको नाम: सुधारिएको घट्ट निर्माण खडियान

उपभोक्ता समितिको दर्ता नं.

उपभोक्ता समिति अध्यक्षको नाम: जमन सिंह देउरुली

सेवा पुग्ने क्षेत्र: तल्लो खडियान मल्लो खडियान

लाभान्वित घरधुरी: ३०

लाभान्वित जनसंख्या: १२० महिला ६५ पुरुष ५५

उपभोक्ता समिति सदस्य संख्या: ७ महिला ४ पुरुष ३

योजना अन्तर्गत निर्माण हुने संरचनाहरू

क्र.स.	योजनाका अंगहरू	संख्या
१	इन्टेक	२
२	फोरवे टर्की	१
३	सुधारिएको पानी घट्ट	१
४	शौचालय कोठा	१
५	सेम्टिक टर्की	१

सामाजिक तथा प्राविधिक परिचालन

गाउँपालिका परियोजना कार्यान्वयन इकाई

अपिहिमाल गाउँपालिका दाचुला

विस्तृत लागत विवरण

विवरण

निर्माण सामाग्री पोलिथिन पाईप

अन्य निर्माण सामाग्री

अदक्ष श्रम

दक्ष श्रम

स्थानीय सामाग्री ढुवानी

बजार सामाग्री ढुवानी

स्टोर भाडा रोडहेडमा

योजनाको सूचना पाटी

उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन सर्च

जम्मा

अनुमानित लागत रु.

४०,०४३.६३

१२८,१५८.८०

३३०,९७९.८०

६०,४४९.३२

२८,६५३.८०

९८,४६९

१०००.००

१०,०००.००

१०,०००.००

६,२७,७३०.४७

वास्तविक लागत रु.

सुधारिएको घट्ट घर नि.

फोरवे टर्की निर्माण

३५८,९८६.९९

एच.डि.पि.ड. पाइप, फिटिङ

पाइप लाईन खान्ने पुगे

कार्य २०४५४९.४९

१०,०००.००

१०,०००.००

५,९४,३९३.९०

लागत व्यहोर्ने निकायहरू

समुदायको वस्तुगत सहयोग

नगद सहयोग

NRDF को तर्फबाट/गाउँपालिकान.

नेपाल सरकार

फिनल्याण्ड/युरोपियन युनियन

जम्मा

१२५,५४६.०९

१०,५५५८.७२

३९६,७२५.६५

६,२७,७३०.४७

५,९४,३९३.९०

Cowater

सुधारिएको घट्ट, अपिहिमाल वडा नं. ६ खडियान





प्रयोगकर्तामैत्री शौचालय निर्माण हुदै महादेब मा वि धुसा, अपिहिमाल वडा नं. २





प्रयोगकर्तामैत्री शौचालय निर्माण डाडाबाग आ वि, अपिहिमाल वडा नं. ५

Co funded by
the European Union

SUOMI
FINLAND

अपिहिमाल गाउँपालिका
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना
सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला

डाडाबाग आ.वि. शौचालय निर्माण योजना

सामाजिक तथा प्राविधिक विवरण

उपभोक्ता समितिको नाम: डाडाबाग आ.वि. शौचालय निर्माण योजना

उपभोक्ता समिति दर्ता नं.

सेवा पुग्ने क्षेत्र: डाडाबाग आ.वि. लुम्बिनी

लाभान्वित विद्यार्थी संख्या:

जम्मा-४७

दलित-११

अन्य

छात्रा

छात्र

छात्रा

छात्र

छात्रा

छात्र

२३

२४

५

६

छात्रा

छात्र

योजना अन्तर्गत निमाण हुने संरचनाहरू

क्र.सं.

योजनाका अंग

१

१

सफ्टीक टंकी

१

२

शौचालय कोठा

३

३

अपाङ्गता मैत्री

१

४

धारा संख्या

४

५

विस्तृत लागत विवरण

विवरण

अनुमानित लागत रु

वास्तविक लागत रु

वाह्य निर्माण सामग्री

३१२३४.२८

३३४४५.५८

स्थानीय निर्माण सामग्री संकलन

१६१०२०.५१

१६८८५७.८६

तथा अन्य अदक्ष श्रम

१७३१०८२.७६

१७११०८८.५०

दक्ष श्रम

१३३४४६.१५

१३२२६१.६०

साधन द्वारा दुवानी

१२३१६.

२१५१५.१३

संचार बाट

-

-

मानिस

-

-

योजनाको सूचना पार्टी

१६०००.००

१६०००.००

उ.स.छवस्थापन तथा अन्य खर्च

१००००.००

१००००.००

जम्मा

१०८०६८.५४

१०६५६७.४०

लागत व्यहोर्ने श्रोत तथा निकायहरू

समुदायको

वस्तुगत सहयोग

१२०१९१.६०

१६३१९.४५

नगद सहयोग

प्राकृतिक विकास कोषको

१८१६९३.७१

१८१३१३.४९

गाउँपालिका नगद

नेपाल सरकार

५९९३२५.२४

५९९३३४.५३

फिन्ल्याण्ड/युरोपियन युनियन

१०८०६८.५४

१०६५६७.४०

जम्मा

सामाजिक तथा प्राविधिक परिचान


गाउँपालिका परियोजना कार्यान्वयन इकाई

अपिहिमाल गा.पा.

दार्चुला



प्रयोगकर्तामैत्री शौचालय निर्माण भवानी मा.वि, सौगन्ना अपिहिमाल वडा नं. ५

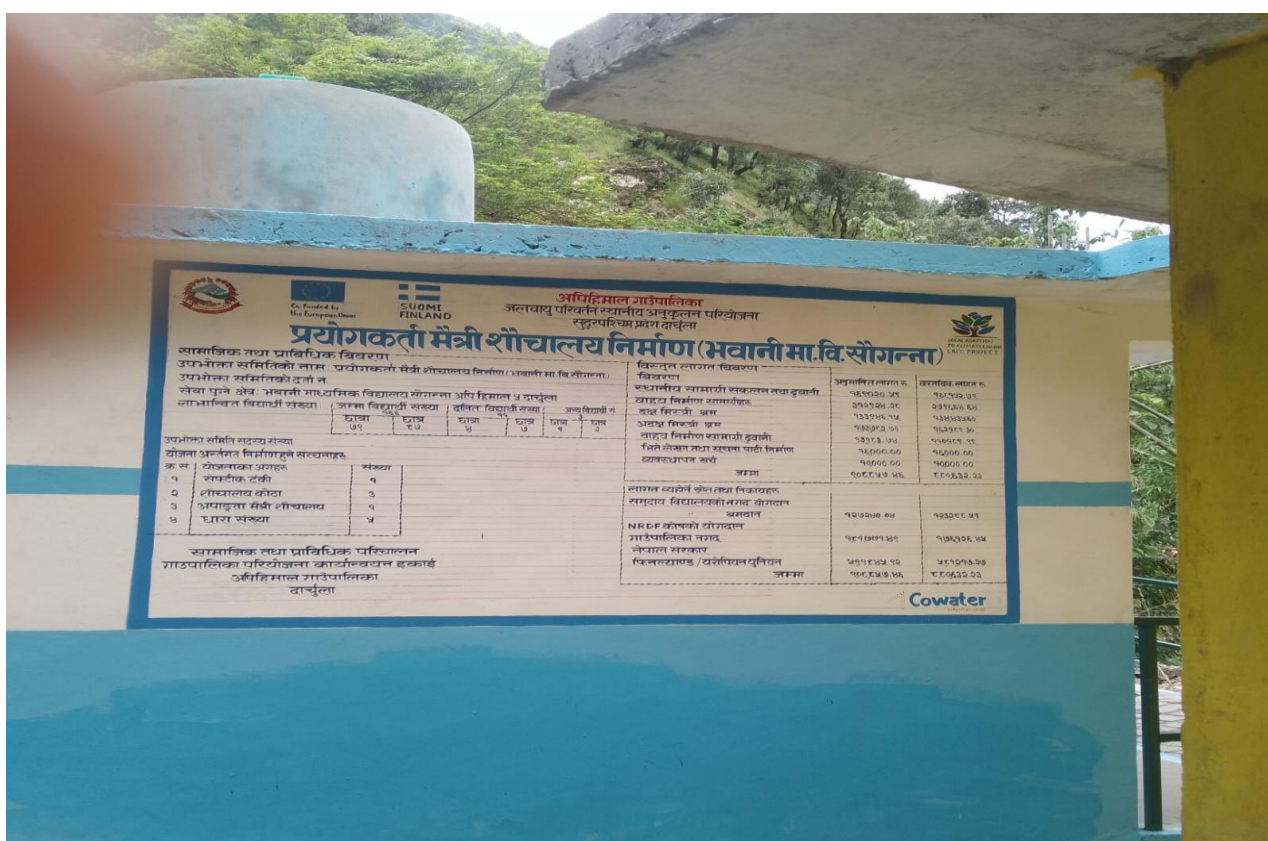[illegible]



पानीको मुहान संरक्षण योजना बिरे मुहान अपिहिमाल वडा नं. १ क्षेत्री





निर्माणाधिक चिलढुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना अपिहिमाल ४





निर्माणाधिक चिलढुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना अपिहिमाल ४ को रोप वे बाट निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दै गरेको तस्वीर



निर्माणाधिक नौपाटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना अपिहिमाल ४



ईन्सिनेटर निर्माण हुदै



निर्माण सम्पन्न लुम्बी कानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको पहिलो अनुगमन कार्यक्रम



निर्माण सम्पन्न लुम्थी कानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको RVT निर्माण हुदै गर्दाको तस्वीर

15/02/2026 17:04



निर्माण सम्पन्न खप्तोली नौपाटा पाईप सिचाइ योजनाको अन्तिम अनुगमन







निर्माणआधिन चौबिसन पाइप सिचाइ योजनाका लागि अण्ठ्यारो भूगोलमा कार्य हुदै



निर्माणआधिन चौबिसन पाइप सिचाइ योजनामा निर्माण कार्य हुदै



डोलारी कृषक समुहमा सामग्री समुदायमा ढुवानी गर्दै समुदायका महिलाहरू

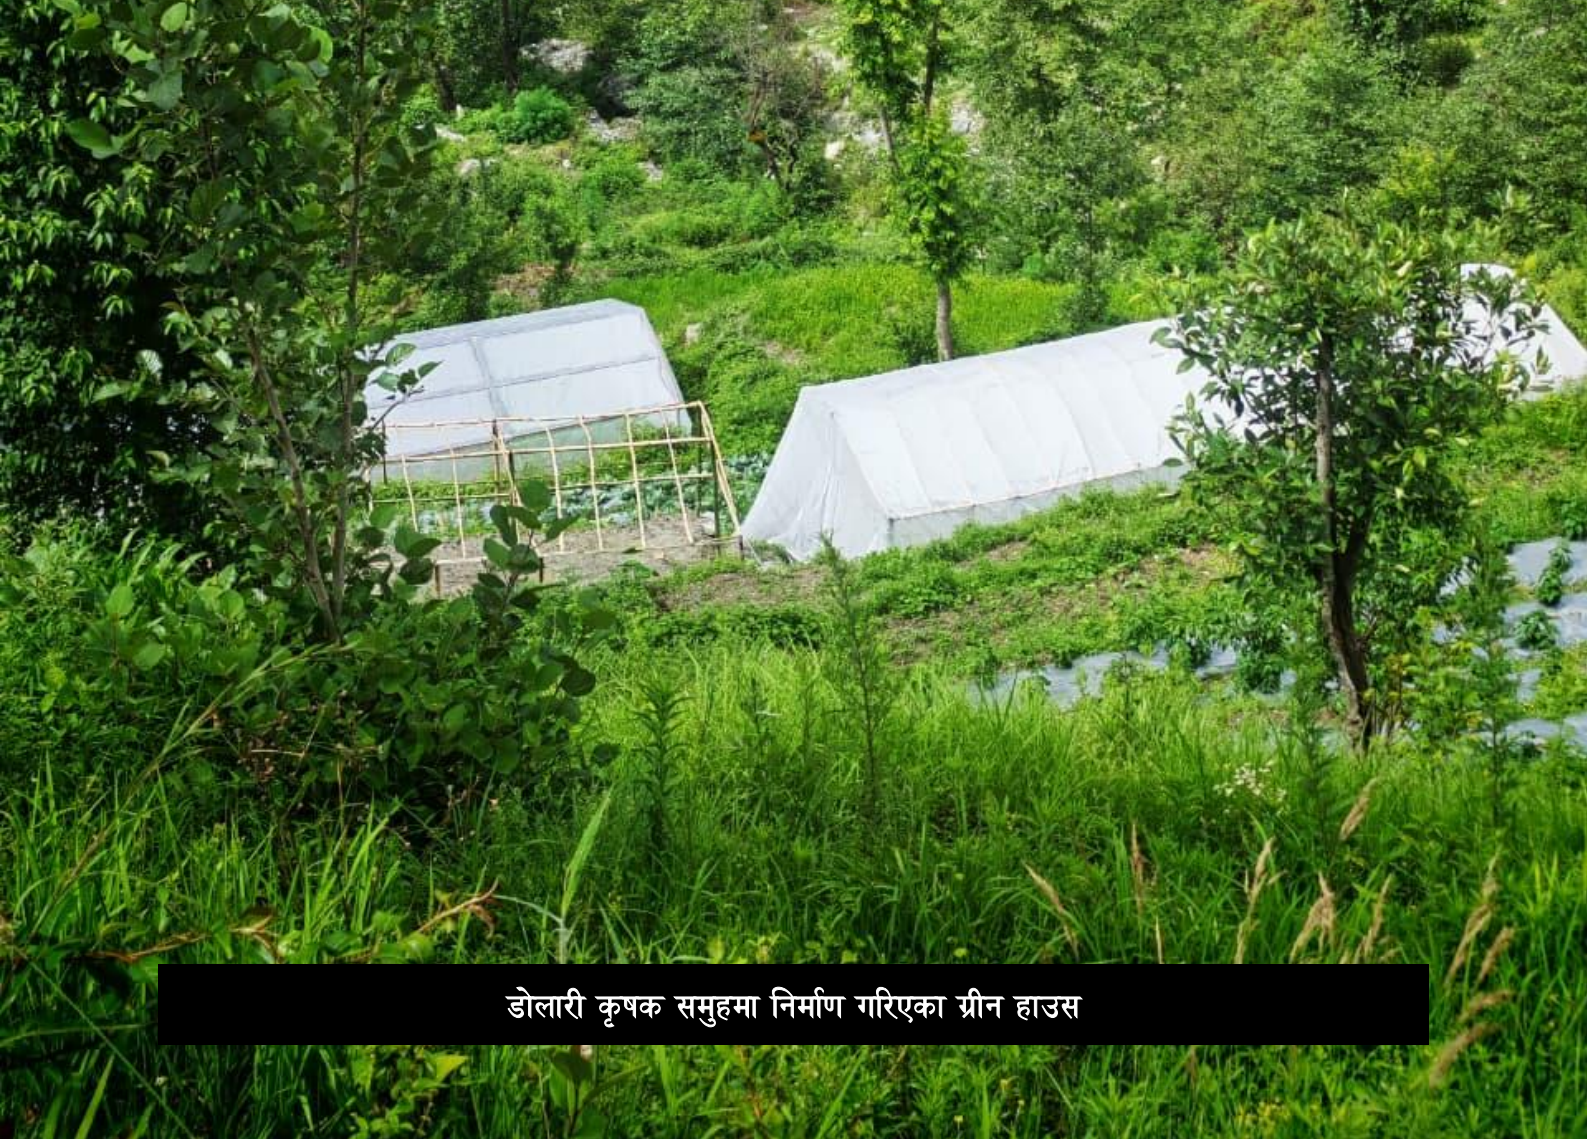

डोलारी कृषक समुहमा निर्माण गरिएका ग्रीन हाउस



थुम्ती बाढी पहिरो नियन्त्रण योजनाको निर्माण कार्य हुदै गर्दाको तस्वीरमा



बृक्षारोपण कार्यक्रम अन्तरगत सुन्तला जातको बिरूवा रोप्दै स्थानीय महिला



बृक्षारोपण कार्यक्रम



सुधारिएको चुलो कार्यक्रम



विद्यालय सुधारिएको चुलो तथा भान्सा घर निर्माण योजना



अपिहिमाल गाउँपालिका उप-जलाधार क्षेत्र निर्धारण तथा परियोजना प्राथमिकता कार्यान्वयन क्षेत्र निर्धारण नक्सा
